


집재기(중량물) 및 굴삭기(건설기계)작업 계획서

작업계획서(작성예시)



작업계획서

[목 차]

- ① 작업개요
- ② 사전조사
- ③ 기계제원(장비)
- ④ 중량물 제원
- ⑤ 작업방법
- ⑥ 안전대책
- ⑦ 작업계획도
- ⑧ 신호방법
- ⑨ 근로자 확인

※ 본 양식은 작업계획서 작성 샘플입니다. 현장별 작업조건, 특성 및 상황을 고려하여 현장 여건에 맞게 작성 및 수정하여 사용하시기 바랍니다.

※ 상황에 따라 다른 작업의 작업계획서(굴착, 중량물 등)와 통합 작성

※ **작업계획서 제출대상 사업이 있을 경우 작성 제출**

(설계도서 확인 불가 및 대여장비 등의 경우 착공 전 안전관리계획서 등에 포함하여 제출)

차량계 건설기계, 중량물 취급 등 작업계획서 (예시)

작성일 : 20 . 00. 00.

관리감독자 (현장대리인)	(인)	안전보건관리책임자 (사업주)	(인)
------------------	-----	--------------------	-----

※ 작성 시기 ※

1. 최초 작업 전 작성, 안전보건관리책임자까지 결재
2. 작업내용(위치, 작업경로, 작업장소) 및 장비 변경 시 추가 작성
3. 해당 없는 항목에는 "해당없음"으로 표시

1. 작업 개요

※ 차량계 건설기계(안전보건규칙 별표6) : 불도저, 그레이더, 로더, 스크레이퍼, 굴착기(우드그랩 포함), 백호우, 항타기, 항발기, 어스오거, 로울러, 콘크리트 펌프카, 덤프트럭, 콘크리트 믹서 트럭 등

	☒ 차량계 건설기계 작업	☒ 굴착작업	☒ 중량물 취급작업
현 장 명	20 년 000 임도	작 업 기 간	20 . 04. 01 ~ 20 . 10. 31.
작 업 장 소	강원도 영월군 상동면 내덕 산1	주 요 공 종	굴착, 토공
작업지휘자	현장대리인(홍길동), 작업반장(한라산)	근 로 자 수	10 ~ 20명

2. 사전 조사

기계 작동 상태	적정, 보통 부적정
지형·지반 상 태	경사도 10% 미만, 토사, 암

3. 기계 제원 "투입 기계장비 모두 작성"

<차량계건설기계 1>

장비명/모델명	굴착기 / 300LC-5
등 록 번 호	서울 02 로 0000
운전원 면허	김안전 / 00-000-00000-00
검사유효기간	2022. 00. 00. ~ 2023. 00. 00
장 비 규 격	10,540(전장)×3,200(전폭)
장 비 중 량	30.3ton

<차량계건설기계 2>

장비명/모델명	굴착기 / DX140W-5
등 록 번 호	서울 02 나 0000
운전원 면허	백두산 / 00-000-00000-00
검사유효기간	2022. 00. 00. ~ 2023. 00. 00
장 비 규 격	7,420(전장)×2,4950(전폭)
장 비 중 량	14.3ton

<중량물 취급기계 1>

장비명/모델명	
등 록 번 호	
운전원 면허	
검사유효기간	
장 비 규 격	
장 비 중 량	

<중량물 취급기계 4>

장비명/모델명	
등 록 번 호	
운전원 면허	
검사유효기간	
장 비 규 격	
장 비 중 량	

<하역운반기계 1>

장비명/모델명	덤프트럭 / VOLVO FM
등 록 번 호	전남 02타 0000
운전원 자격면허	김안전 / 00-000-00000-00
검사유효기간	2022. 00. 00. ~ 2023. 00. 00
장비규격	8,825(전장)×2,495(전폭)
최대적재량	25.5톤

<하역운반기계 2>

장비명/모델명	
등록번호	
운전원 자격면허	
검사유효기간	
장비규격	
최대적재량	

* 첨부서류 : 장비별 건설기계등록증, 운전원 면허증(건설기계조종면허), 보험가입증권 사본 각 1부

4. 중량물 제원 “중량물 취급작업 시 작성”

중량물 종류	돌	줄걸이 방법	2줄 걸이
줄걸이 용구	체인, 슬링벨트		

5. 작업 방법



작업방법 (작업순서)	<굴착, 운반> 1. 굴착, 토공 2. 터파기, 흙 운반 3. 되메우기 *토사 반출 방법 : 반출계획 없음	<중량물 취급> 1. 터파기 2. 돌 인양 3. 돌 쌓기

6. 안전 대책

구 분	안전대책
차량계 건설기계 작업	•작업 전 장비상태 확인 •운전원 안전벨트 착용 •인양물 인근에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자 배치 •운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고 시동기 분리 •점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지지대, 안전블록 사용 •주행속도 준수 : 10km/h
중량물 작업	•추락위험 : 안전모 및 안전벨트 착용 •낙하위험 : 안전모 착용, 전조증상이 있을 경우 작업중지 •전도위험 : 안전모 및 안전벨트 착용, 급경사지 작업금지 •협착위험 : 작업 전 작업반경내 근로자 유무 확인, 신호수 배치 •붕괴위험 : 과굴착 금지, 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지 •기타위험 : 버킷 안전핀 체결, 작업 전 기계장비 점검
차량계 하역운반기계작업	•작업 전 장비상태 확인 •운전원 안전벨트 착용 •승차석 이외의 위치에 근로자 탑승금지, 경보장치 작동여부 확인 •운전석 이탈 시 원동기 정지 및 브레이크를 확실 시 걸어 둠 •점검 시 적재함 등이 내려오지 않도록 안전지지대, 안전블록 사용 •주행속도 준수 : 10km/h

7. 운행경로 및 작업계획도

* 포함사항 : 작업위치, 운행경로, 신호수, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선 등) 위치 등

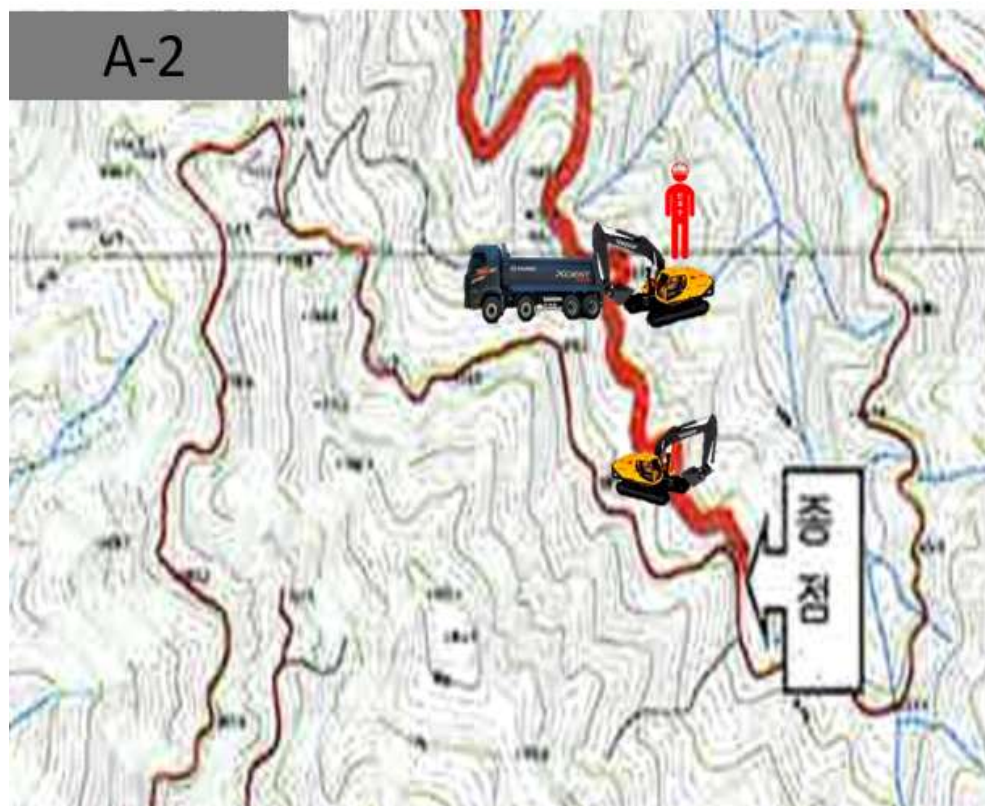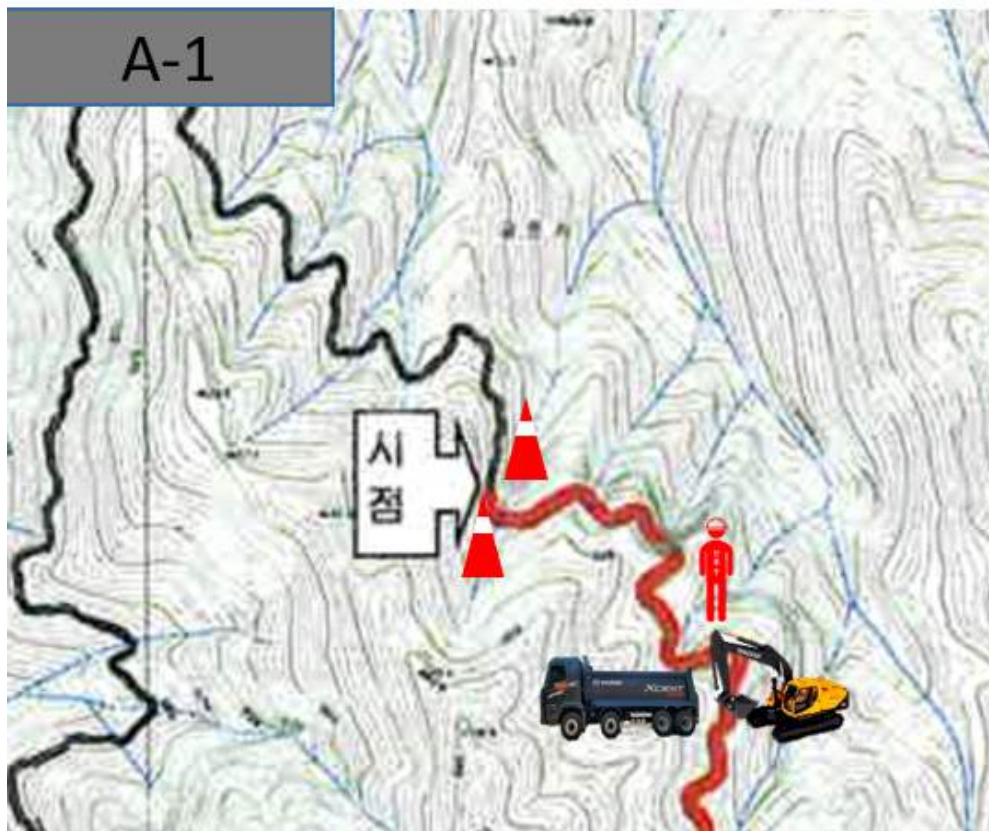

8. 사업장 내 연락방법 및 신호방법

① 내부 비상연락망

직 책	성 명	연 락 처	비 고
현장대리인			
사무실			
굴착기 운전원			
덤프트럭 운전원			
작업반장			
기타			

② 연락방법 및 신호방법

연락방법	휴대전화, 무전기 등			
신호방법	☒ 육성 및 수신호, ☐ 무전기사용, ☐ 기타()			
	 안전하게 이동 호각을 짧게 불면서 한 손을 들고 손바닥을 진행방향으로 펴고 흔든다.	 우로 호각을 길게 불면서 오른손을 위로 올려 옆으로 흔든다.	 좌로 호각을 길게 불면서 왼쪽을 위로 올려 옆으로 흔든다.	
	 정지 호각을 길게 불면서 한 손을 들고 운전자를 향해 높이 올린다.	 긴급정지 호각을 짧게 연속으로 불면서 양손을 벌리고 높이 들어 흔든다.	 우측으로 천천히 이동 호각을 짧게 불면서 우측 손을 올리고 좌측 손으로 좌우로 흔든다.	 좌측으로 천천히 이동 좌측 손을 올리고 우측 손으로 좌우로 흔든다.

9. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 “해당 시 작성”

10. 매설물에 대한 이설·보호대책 "해당 시 작성"

지중매설물	매설물 유무 확인결과	조치여부	담당업체
도시가스	해당 없음	해당 없음	
광케이블	해당 없음	해당 없음	
전기	해당 없음	해당 없음	
상수도	상수도 매설	이설 필요	00상수도 사업본부

<지하매설물 현황도> "해당 시 작성"

11. 근로자 작업계획서 및 안전보건교육 확인

근로자 성명	교육내용	서명 확인

* 사업주는 작업계획서의 내용을 근로자에게 알려야 함
