

(연도별/월별) 유수율 분석 양식

□ 연도별 작성양식

□ 총 계

				전년 (㎡)	금년 (㎡)	차 이	원인분석	사업추진내역								
								구분	관 개대체	누수복구(건수)		누수수선 (만원)	계량기교체	수압제어	급수전수	기타
										탐사	복구					
종급수량	유효수량	유수수량	소계					추진물량	2.5 km	20	15	10	25		500	
			요금수량					추진내용	-위치 -공사기간 -관로정보 (관경, 관종) -기타	-위치 -수행방법 -기간 등	-위치 -수행방법 -기간 등	-위치 -수행방법 -기간 등	-감압밸브 위치 및 정보 -감압량 -운전방식 -해당구역 정보 -해당구역의 수압변화 등	-증감지역 정보 -기타	-기타공사로 인한 이투물 량 발생 -소방용수 사용량 등	
			분수량													
			기타													
		유효무수수량	소계													
			수도사업용수량													
			공공수량													
			부정사용량													
			계량기불감수량													
	무효수량	무효무수수량	소계													
			조정감역수량													
			누수량													

종급수량 (㎡)			
유수수량 (㎡)			
무수수량 (㎡)			
누수량 (㎡)			
유수율 (%)			
인정 유효무수수량 (㎡)			
인정 유수수량 (㎡)			
인정 유수율 (%)			

※ 사업추진내역 작성시 : 간략한 내용 및 물량(내역)을 정리하고, 세부내용은 별첨자료로 첨부
※ 블록시스템 구축 전단계의 센터는 배수지계통별 작성하고, 구축 완료된 센터는 소블록별 작성
- 소블록별 작성 : 정음센터
- 계통별 작성 : 정음을 제외한 모든 센터(※ 블록구축 후 소블록별 분석시행)
※ 인정 유효무수수량(㎡) : 관 세척 시 간이유량계를 설치하여 측정한 배출수량
※ 인정 유수수량(㎡) : 인정 유효무수수량을 반영한 유수수량
※ 인정 유수율(%) : 인정 유효무수수량을 유수수량에 가산하여 구한 유수율

□ 계통(또는 소블록)

계통(블록)명 :				전년 (㎡)	금년 (㎡)	차 이	원인분석	계통(블록)별 세부 사업추진내역								
								구분	관 개대체	누수복구(건수)		누수수선 (만원)	계량기교체	수압제어	급수전수	기타
										탐사	복구					
종급수량	유효수량	유수수량	소계					추진물량	2.5 km	20	15	10	25		500	
			요금수량					추진내용 -위치 -공사기간 -관로정보 (관경, 관종) -기타	-위치 -수행방법 -기간 등	-위치 -수행방법 -기간 등	-위치 -수행방법 -기간 등	-감압밸브 위치 및 정보 -감압량 -운전방식 -해당구역 정보 -해당구역의 수압변화 등	-증감지역 정보 -기타	-기타공사로 인한 이투물 량 발생 -소방용수 사용량 등		
			분수량													
			기타													
		유효무수수량	소계													
			수도사업용수량													
			공공수량													
			부정사용량													
			계량기불감수량													
		무효수량	무효무수수량	소계												
				조정감역수량												
				누수량												

공급량(배수지 유출유량 또는 블록유입유량) (㎡)			
유수수량 (㎡)			
무수수량 (㎡)			
누수량 (㎡)			
유수율 (%)			
인정 유효무수수량 (㎡)			
인정 유수수량 (㎡)			
인정 유수율 (%)			


※ 인정 유효무수수량(㎡) : 관 세척 시 간이유량계를 설치하여 측정한 배출수량
※ 인정 유수수량(㎡) : 인정 유효무수수량을 반영한 유수수량
※ 인정 유수율(%) : 인정 유효무수수량을 유수수량에 가산하여 구한 유수율

□ 월별 작성양식

□ 총 계

금년도 누적 관리표		전년도 (m³/년)	금년도 누계 (m³/년)	2020년												비 고
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
총 계	총급수량	12,327,014	5,420,487	902,416	993,716	875,396	906,241	870,320	872,398							-
	유수수량	8,618,202	4,105,207	650,821	712,008	645,435	685,388	696,665	714,890							-
	무수수량	3,708,812	1,315,280	251,595	271,708	229,961	220,853	157,508	157,508							-
	유수율(%)	69.9%	75.7%	72.1%	71.7%	73.7%	75.6%	80.0%	81.9%							-
	인정 유효무수수량	123,270	54,205	9,024	9,937	8,754	9,062	8,703	8,724							-
	인정 유수수량	8,741,472	4,159,412	659,845	721,945	654,189	694,450	705,368	723,614							-
	인정 유수율(%)	70.9%	76.7%	73.1%	72.7%	74.7%	76.6%	81.0%	82.9%							-


<년간 유수율 그래프>

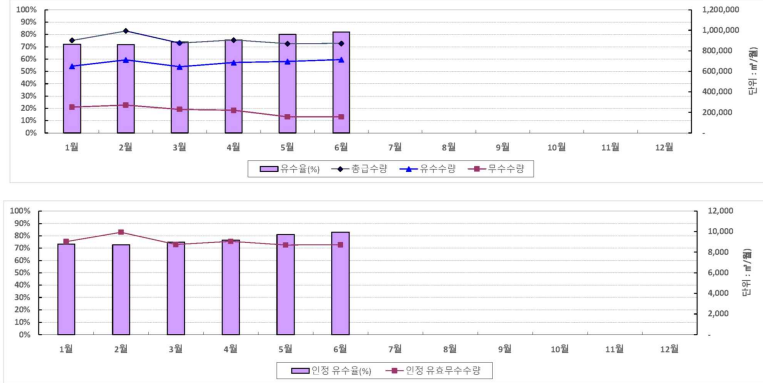

□ 계통(또는 소분류)별 분석표

금년도 누적 관리표		전년도 (m³/년)	금년도 누계 (m³/년)	2020년												비 고
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
○○계통 (또는 ○○분류)	총급수량	369,816	171,363	30,818	33,309	31,054	29,737	24,090	22,355							-
	유수수량	176,856	94,320	14,738	15,795	14,284	16,258	16,050	17,195							-
	무수수량	192,960	77,043	16,080	17,514	16,770	13,479	8,040	5,160							-
	유수율(%)	47.8%	55.0%	47.8%	47.4%	46.0%	54.7%	66.6%	76.9%							-
	인정 유효무수수량	3,698	1,714	308	333	311	297	241	224							-
	인정 유수수량	180,554	96,034	15,046	16,128	14,595	16,555	16,291	17,419							-
	인정 유수율(%)	48.8%	56.0%	48.8%	48.4%	47.0%	55.7%	67.6%	77.9%							-

<년간 유수율 그래프>

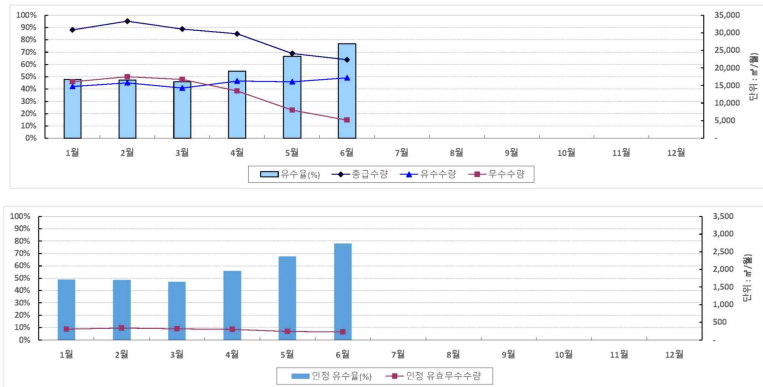

금월 분석표		5월 (m³)	6월 (m³)	차 이	증감 원인분석	계통(분류)별 세부 사업추진내역									
						구분	관 개대세	누수복구(건수)		누수수선 (만원)	계량기교체	수입제어	금수전수	기타	
○○계통 (또는 ○○분류)	총급수량	24,090	22,355	- 1,735		추진물량	2.5 km	탐사	복구	10	25		500		
	유수수량	16,050	17,195	1,145		추진내용	-위치 -공사기간 -관로정보 (관경, 관종) -기타	-위치 -수행방법 -기간 등	-위치 -수행방법 -기간 등	-위치 -수행방법 -기간 등	-위치 -수행방법 -기간 등	-감압밸브 위치 및 정 보 -감압방식 -해당구역 정보 -해당구역의 수압변화 등	-중감지역 정보 -기타	-기타공사로 인한 이투물 량 발생 -소방용수 사용량 등	
	무수수량	8,040	5,160	- 2,880											
	유수율(%)	67.0%	77.0%	10.0%											
	인정 유효무수수량	241	224	- 17											
	인정 유수수량	16,291	17,419	1,128											
	인정 유수율(%)	67.6%	77.9%	10.3%											

<년간 야간최소유량 그래프>

** 세무 D/B : 별첨

