【별표 1】

○○사방시설 관리대장

▣ 일반현황

관리번호	시·도(지방청) - 0001(▼▲) * 연도별 순			국가지점번호			
시 행 청	○○시·도(○○지방산림청), ○○산림환경연구소,○○시·군·구(○○국유림관리소) (▼▲)						
시공위치	소재지	○○도 ○○ 군 ○○면 ○○리 산 138번지 외 1(국유림)				지도찾기	
	GPS좌표 (Map Datum : WGS84)	(N) 36° 4′ 27.1″, (E) 127° 37′ 23.2″			소유구분	국·공·사(▼▲)	
예산배정년도	2013년(▼▲)	사업완료년도	2013년(▼▲)		공사기간	2013-03-15 ~2013-06-15(달력클릭)	
사업구분	산지보전(▼▲)	사업량	1.0ha(㎞)		계약방법	수의·공개(▼▲)	
사 업 비	국 비	220백만원	지방비	0 백만원	계	220백만원	
산 사 태 취약지역	실태조사구분	산사태·토석류, 황폐지((▼▲)		조사일자	2012-10-10(달력클릭)		
	지정고시번호			지 정 일	2013-02-10(달력클릭)		
	해제고시번호			해 제 일	2018-06-30(달력클릭)		
하자보수기간	2013-06-26 ~ 2018-06-25(달력클릭)						
설 계 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)		
시 공 자	소속	산조중앙회 ○○지역본부		성명	○○○(☎)		
감 리 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)		
공사감독자	직	임업서기		성명	○○○		
준공검사자	직	임업주사		성명	○○○		
	직	임업서기		성명	○○○		
특 이 사 항	하수도 연결(하수도 관경 mm, 연결하천명), 시범지역조성, 감시카메라 등						

▣ 시공현황

주요 시설내용			
흙 막 이	개소	기슭막이	㎡
골 막 이	개소	수로내기	m
바닥막이	개소	나무심기	본

▣ 타당성평가 결과

평가년도	2013년	평가자	
평가의견	사방사업명	주요 시설	개략공사비
	(▼▲)	(▼▲)	백만원

▣ 하자보수 점검결과 및 조치

하자점검일	점검자		점검결과	조치사항	
	직	성명		일자	내용
2014. 6. 1 (달력클릭)	임업주사	○○○	뒷채움돌 빠짐	2014. 6. 1 (달력클릭)	보완시공

※ 하자보수 점검기간 : 5년

▣ 사방시설 점검(안전진단) 결과 및 조치

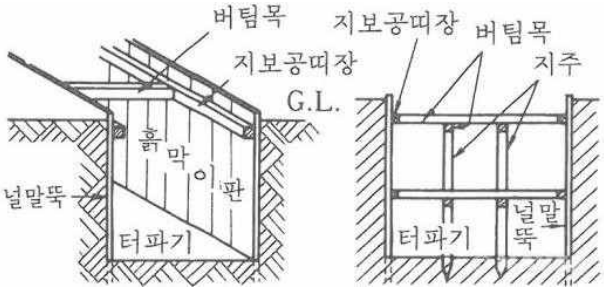
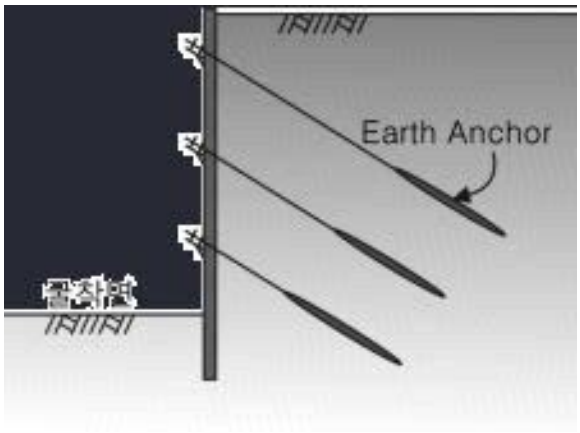
점검년도	2013년(▼▲)	점검일자	2014. 6. 1(달력클릭)	점검자	
점검결과	종합의견		보수 필요사항	-	
	양호·관찰필요·불량(▼▲)		바닥파임	필요·불요(▼▲)	
조치결과	조치완료·조치계획(▼▲)		시 공 자		
조치내용	예) 뒷채움돌 보강조치				
사업기간	2013. 9.30 ~ 2013. 10.30 (달력클릭)				
사 업 비 (천원)	계		국비	지방비	
	10,000		7,000	3,000	

※ 점검결과는 용역수행자 또는 해당 기관에서 입력

▣ 사방지 지정·해제현황

소재지	지정고시번호(일자)	지정면적(㎡)	해제고시번호(일자)	해제면적(㎡)
	2013-211(달력클릭)	1,250	(달력클릭)	

▣ 사방시설 도면 업로드(예시 : 바닥막이)

	
측면도 - (1)	측면도 - (2)

▣ 사방시설 이미지 업로드

전경사진(시행전)	전경사진(시행후)
그 외 기타사항	그 외 기타사항

<붙임>

○○사방시설 관리대장 작성요령

가. 일반현황

1) 관리번호 : 시·도(지방산림청) - 일련번호

* 관리번호는 시·도(지방청)를 기준으로 관리대장 입력시 자동부여하고 기관별 조성자료 등은 검색기능 활용

2) 국가지점번호 : 국가지점번호 등록 대상 시설에 포함될 경우 등록번호 부여받아 입력

3) 시 행 청 : 사방시설을 실행한 기관에서 작성

4) 시공위치 : 행정구역의 지번까지 기재하고 좌표는 WGS84 체계로 단일화

* 좌표는 본체 중앙부를 기준으로 취득

5) 소유구분 : 국유림, 공유림, 사유림으로 구분하여 기재

6) 사업시행 기준 : 예산배정·사업완료 년도(회계년도 기준)를 모두 기재

7) 사업구분 : 세부사업명을 기재

o 산지사방 : 산사태예방, 산사태복구, 산지보전, 산지복원

o 해안사방사업 : 해안방재림 조성, 해안침식 방지

o 야계사방사업 : 계류보전, 계류복원

8) 사업비 : 관급자재대를 포함한 사업완료(정산)금액으로 하고 국비와 지방비를 구분하여 백만원 단위로 작성

9) 산사태취약지역 : 산사태취약지역 실태조사 일자 및 지정(해제) 고시일을 기준으로 고시번호 및 일자 기재

10) 특이사항 : 하수관 연결사항, 시범지역 조성, 감시카메라 설치현황 등 현지 특이사항 기재

나. 시공현황(주요 시설내용)

o 흙 막 이 : 돌, 돌망태, 통나무, 콘크리트 등

o 골 막 이 : 돌, 흙, 바자, 돌망태, 콘크리트블록, 통나무 등

o 바닥막이 : 콘크리트, 통나무, 돌망태

o 기슭막이 : 옹벽, 찰쌓기, 메쌓기, 전석쌓기, 콘크리트 블럭 등

o 수로내기 : 떼, 돌, 콘크리트, 콘크리트블록판, 반원관, 파식수로내기 등

o 기　　타 : 퇴사울타리, 정사울타리, 방풍공, 나무식재 등

다. 타당성평가 결과(「사방사업법」 제7조의3)

1) 평가년도 : 타당성평가 실행년도를 기재

2) 평가자 : 위탁시행과 자체시행을 구분하여 기재

3) 평가의견 : 사방사업 종류, 주요 공종, 개략공사비 기재

라. 하자보수 점검결과 및 조치 : 하자보수 보증기간(5년) 내 사방시설의 하자발생 여부 점검결과 및 조치사항을 기재

* 하자발생 내역이 없더라도 점검결과 이상유무 등 기록입력

마. 사방지 점검(안전진단) 결과 및 조치 : 「사방사업법」 제15조에 따른 사방시설 안전진단 결과를 기재

바. 사방지 지정·해제현황 : 사방지 지정·해제내역(고시번호, 지정·해제일시, 면적)을 기재

사. 사방시설 도면 : 정면도, 평면도, 구조도, 종단면도 등 설계도면

아. 사방시설 사진 : 사방지의 침하·붕괴·균열 등의 발생여부 사진
