【별표 2】

사방댐 관리대장

▣ 일반현황

관리번호	시·도(지방청) - 0001(▼▲) * 연도별 순			국가지점번호			
시 행 청	○○시·도(○○지방산림청), ○○산림환경연구소,○○시·군·구(○○국유림관리소) (▼▲)						
시공위치	소재지	○○도 ○○ 군 ○○면 ○○리 산 138번지 외 1(국유림)				지도찾기	
	GPS좌표 (Map Datum : WGS84)	(N) 36° 4′ 27.1″, (E) 127° 37′ 23.2″			소유구분	국·공·사(▼▲)	
예산배정년도	2013년(▼▲)	사업완료년도	2013년(▼▲)	공사기간	2013-03-15 ~2013-06-15(달력클릭)		
사업구분	사방댐조성(▼▲)	사업량	1 개소	계약방법	수의·공개(▼▲)		
사 업 비	국 비	220백만원	지방비	0 백만원	계	220백만원	
산 사 태 취약지역	실태조사구분	산사태·토석류((▼▲)		조사일자	2012-10-10(달력클릭)		
	지정고시번호			지 정 일	2013-02-10(달력클릭)		
	해제고시번호			해 제 일	2018-06-30(달력클릭)		
하자보수기간	2013-06-26 ~ 2018-06-25(달력클릭)						
설 계 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)		
시 공 자	소속	산조중앙회 ○○지역본부		성명	○○○(☎)		
감 리 자	소속	○○산림기술사사무소		성명	○○○(☎)		
공사감독자	직	임업서기		성명	○○○		
준공검사자	직	임업주사		성명	○○○		
	직	임업서기		성명	○○○		
특 이 사 항	하수도 연결(하수도 관경 mm, 연결하천명), 시범지역조성, 감시카메라 등						

▣ 시공현황

시 설 개 요		사 방 댐 의 규 모	
시 공 목 적	중력식(버팀식, 복합식)(▼▲)	윗 너 비	31.0 m
시 공 형 식	투과형(불·일부투과형)(▼▲)	아 랫 너 비	25.0 m
사 방 댐 종 류	콘크리트댐(▼▲)	유 효 높 이	3.5 m
유 역 면 적	132.0ha	총 높 이	5.5 m
생 태 통 로 여 부	유	방수로두께	m
안 전 휀 스 여 부	유	저 수 량	0.0 m^3
입 간 판 설 치 여 부	유	저 사 량	1,456.0 m^3

▣ 타당성평가 결과

평가년도	2013년	평가자	
평가의견	사방댐형식	사방댐기능	개략공사비
	(▼▲)	(▼▲)	백만원

▣ 하자보수 점검결과 및 조치

하자점검일	점검자		점검결과	조치사항	
	직	성명		일자	내용
2014. 6. 1 (달력클릭)	임업주사	○○○	석축천단 균열	2014. 6. 1 (달력클릭)	천단 보완시공

※ 하자보수 점검기간 : 5년

▣ 사방댐 점검(안전진단) 결과 및 조치

점검년도	2013년(▼▲)	점검일자	2014. 6. 1(달력클릭)	점검자	
점검결과	종합의견		보수 필요사항	준설	
	양호·관찰필요·불량(▼▲)		방수로 유출구 바닥파임	필요·불요(▼▲)	
조치결과	조치완료·조치계획(▼▲)		시 공 자		
조치내용	예) 방수로 유출구 파임 보강조치				
사업기간	2013. 9.30 ~ 2013. 10.30 (달력클릭)				
사 업 비 (천원)	계		국비	지방비	
	10,000		7,000	3,000	

※ 점검결과는 용역수행자 또는 해당 기관에서 입력

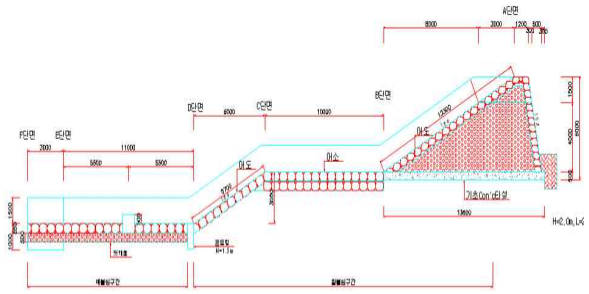
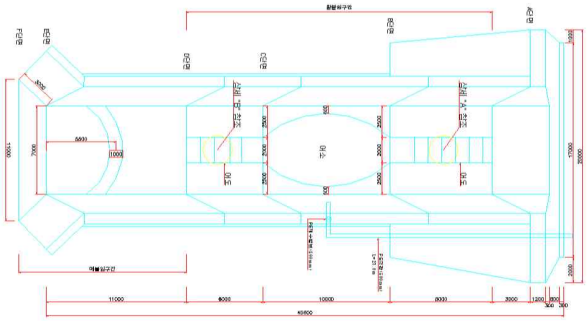
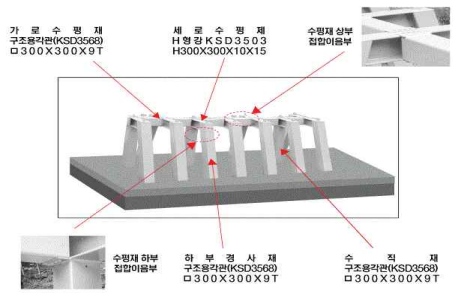
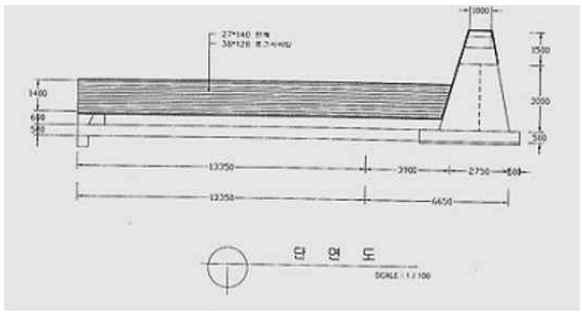
▣ 사방댐준설

사업기간	준설량(㎥)	시공자
2013. 9.30 ~ 2013. 10.30 (달력클릭)	2,100	○○산림조합

▣ 사방지 지정·해제현황

소재지	지정고시번호(일자)	지정면적(㎡)	해제고시번호(일자)	해제면적(㎡)
	2013-211(달력클릭)	1,250	(달력클릭)	

▣ 사방댐 도면 업로드

	
정면도	평면도
	
구조도	종단면도

▣ 사방댐 이미지 업로드

전경사진(시행 전)	전경사진(시행 후)
사방댐 대수면	사방댐 반수면

전경사진(시행 전)	전경사진(시행 후)
그 외 기타사항	그 외 기타사항

<붙임>

사방댐 관리대장 작성요령

가. 일반현황

1) 관리번호 : 시·도(지방산림청) - 일련번호

* 관리번호는 시·도(지방청)를 기준으로 관리대장 입력시 자동부여하고 기관별 조성자료 등은 검색기능 활용

2) 국가지점번호 : 국가지점 등록번호 부여받아 입력

3) 시 행 청 : 사방댐을 실행한 기관에서 산사태정보시스템에 작성

4) 시공위치 : 행정구역의 지번까지 기재하고 좌표는 WGS84 체계로 단일화

* 좌표는 본체 중앙부를 기준으로 취득

5) 소유구분 : 국유림, 공유림, 사유림으로 구분하여 기재

6) 사업시행 기준 : 예산배정·사업완료 년도(회계년도 기준)를 모두 기재

7) 사업구분

o 사방댐조성 : 사방댐 조성사업으로 시공된 사방댐

o 산림유역관리 : 산림유역관리사업으로 시공된 사방댐

o 수해복구사업 : 수해복구사업(예비비 등)으로 시공된 사방댐

o 기타 : 산불피해지 재해방지 목적 등으로 시공된 사방댐

8) 사업비 : 관급자재대를 포함한 사업완료(정산)금액으로 하고 국비와 지방비를 구분하여 백만원 단위로 작성

9) 산사태취약지역 : 산사태취약지역 실태조사 일자 및 지정(해제) 고시일을 기준으로 고시번호 및 일자 기재

10) 특이사항 : 하수관 연결사항, 시범지역 조성, 감시카메라 설치현황 등 현지 특이사항 기재

나. 시공현황

1) 시공목적

o 중력식사방댐 : 토석(土石) 차단을 주 목적으로 하는 경우

o 버팀식사방댐 : 유목(流木) 차단을 주 목적으로 하는 경우

o 복합식사방댐 : 토석(土石)과 유목(流木) 동시 차단을 목적으로 하는 경우

2) 시공형식

o 투 과 형 : 본체의 횡단구조 개방으로 상류토사의 하류이동이 가능

o 일부투과형 : 본체의 횡단구조가 일부 개방되었거나 개방되었더라도 본체기초의 높이로 토사의 하류이동이 제한적인 형태

o 불투과형 : 본체의 횡단구조가 평상시에도 상류에서 하류지역으로 토사 등의 이동이 불가능한 형태

3) 종류구분

유 형	주재료	종 류
o 투과형	콘크리트	콘크리트 슬릿트댐/에코필라댐
	철 강 재	버트리스댐/철강재 슬릿트댐
o 일부투과형	콘크리트	도징댐/콘크리트 슬릿트댐/다기능댐/버트리스댐
	철 강 재	철강재 슬릿트댐/빔크린댐/그리드댐
	와이어로프	와이어로프
o 불투과형	콘크리트	콘크리트댐/블록댐
	철 강 재	셀댐/철강재틀댐
	석 재	전석댐/전석붙임 콘크리트댐
	토 사	흙댐
	목 재	목재댐

4) 유역면적: 유수가 집수되는 산지유역 면적을 ha단위로 기재

5) 사방댐의 규모 : 윗너비, 아랫너비, 유효높이, 총높이, 방수로 너비, 저사·저수량

다. 타당성평가 결과(「사방사업법」 제7조의3)

1) 평가년도 : 타당성평가 실행년도를 기재

2) 평가자 : 위탁시행과 자체시행을 구분하여 기재

3) 평가의견 : 사방댐 형식, 사방댐 목적, 개략공사비 기재

라. 하자보수 점검결과 및 조치 : 하자보수 보증기간(5년) 내의 사방댐의 하자발생 여부 점검결과 및 조치사항을 기재

* 하자발생 내역이 없더라도 점검결과 이상유무 등 기록입력

마. 사방댐 점검(안전진단) 결과 및 조치 : 「사방사업법」 제15조에 따른 사방댐 점검(안전진단) 결과를 기재

바. 사방댐준설 : 사업기간, 준설량 등을 기재

사. 사방지 지정·해제현황 : 사방지 지정·해제내역(고시번호, 지정·해제일시, 면적)을 기재

아. 사방댐 도면 : 정면도, 평면도, 구조도, 종단면도 등 설계도면

자. 사방댐 사진 : 사업시행 전·후 및 사방댐 대수면, 반수면 전경사진 등

* 사방시설의 점검을 전문기관에 의뢰하여 점검한 경우에는 자료 등을 제공받아 입력
