



국방전력발전업무 절차도

(무기체계 · 전력지원체계, 제6조제6항 관련)

1. 무기체계 획득 절차도

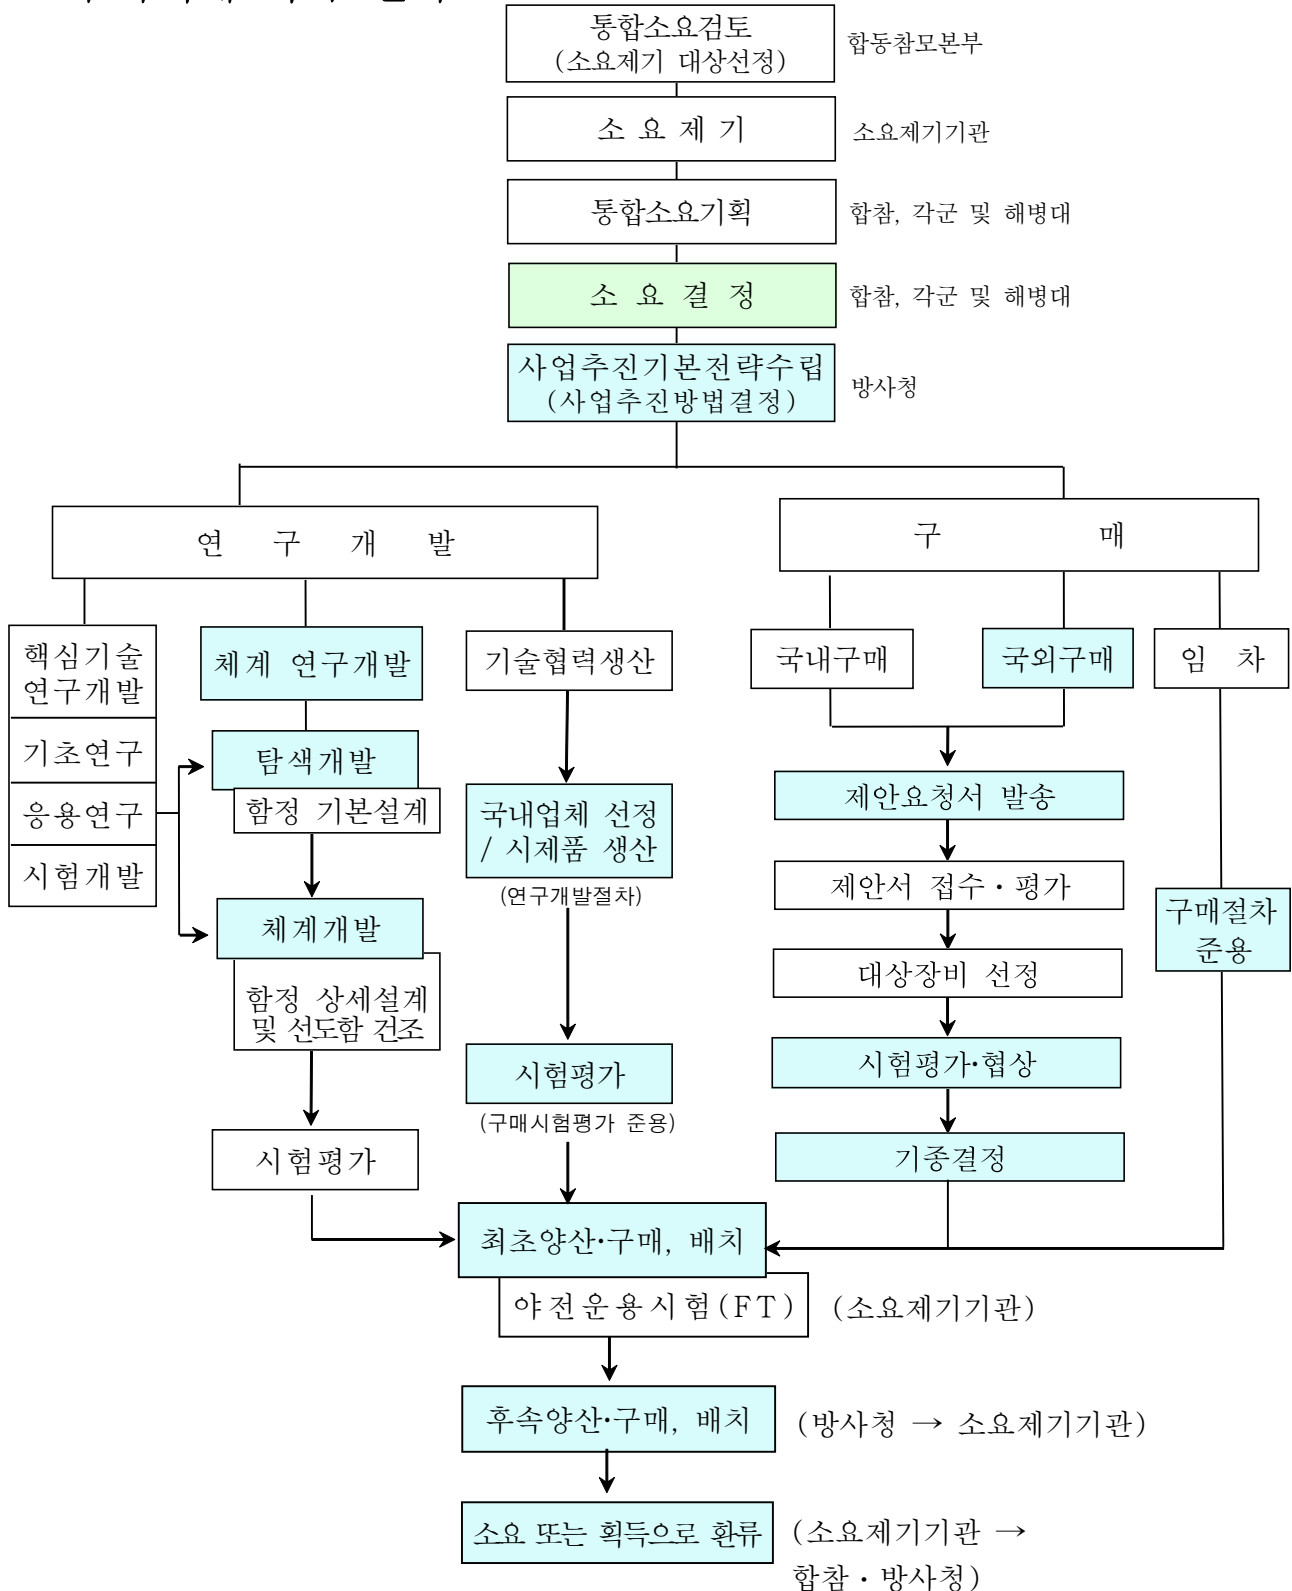

2. 무기체계 획득 절차도(신속소요)

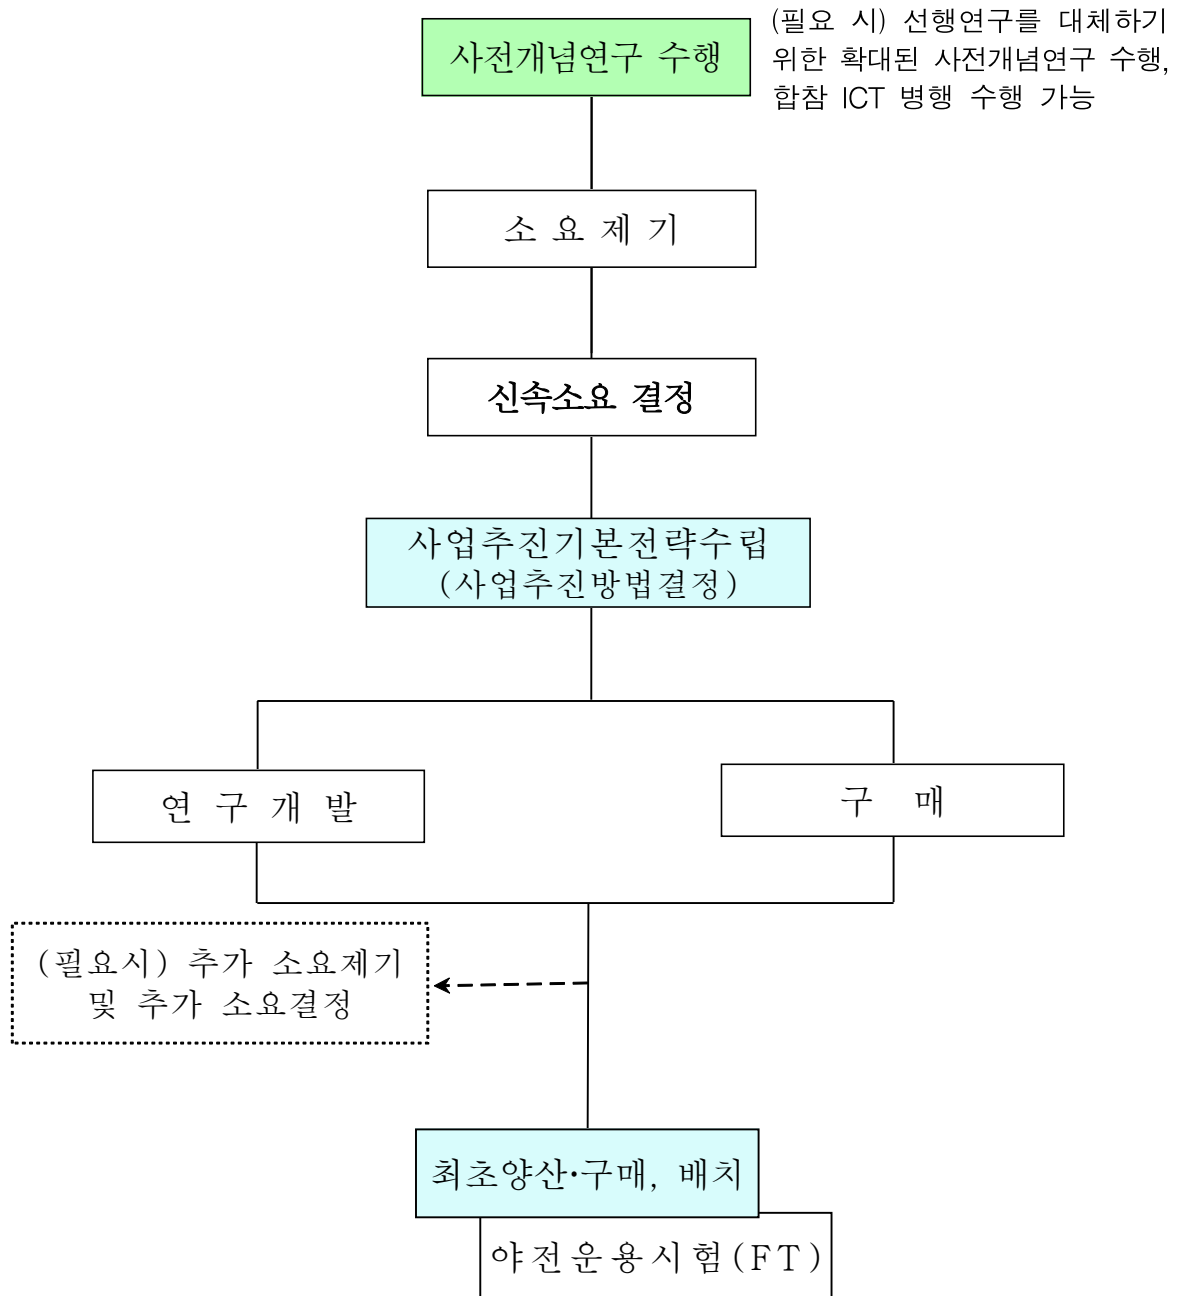

3. 시범사업 업무절차도

1.	예산 편성자료 제출
○각군 및 해병대는 방사청으로 예산편성 자료를 제출 ○예산편성 관련 세부사항은 「국방예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」 등 준용	



2.	대상사업 선정계획 수립
○시범사업의 주체가 F-1년 12월까지 F년도 대상사업 선정계획을 수립	



3.	대상사업 공모
○ 개요, 사업 수요신청 방법 등, 행정사항 및 향후 추진일정 등을 포함 ○ 긴급한 수요 및 안보현안 대응 등을 위해 생략가능	



4.	대상사업 결정
○기관별 자체 위원회 등을 개최하여 대상사업 선정	



5.	시범사업추진계획 수립
○대상사업 결정 1개월 이내에 사업추진계획 수립	



6.	사업수행자 선정
○사업수행자 선정을 위해 제안요청서 수립 및 공고, 제안서 평가 등 수행	

7.	연구개발실행계획서 수립
○선정된 사업수행자가 시범사업추진계획, 제안서 등을 고려하여 작성	



8.	시제품 개발
○연구개발 수행에 따른 시제품 개발	



9.	성능입증시험계획 수립
○시제품의 군 활용성과 성능 등을 입증하기 위한 성능입증시험계획 수립	



10.	성능입증시험팀 구성
○시범사업의 성과를 평가하기 위해 공무원, 민간전문가 등으로 구성된 성능입증시험팀 구성	



11.	성능입증시험 수행
○성능입증시험계획에 따라 시범운용 및 성능시험 등 성능입증시험 수행	



12.	성능입증시험 결과 판정
○성능입증시험에 따른 평가 결과를 종합적으로 판단하고 판정 결과(군 활용성 적합 또는 부적합 등)를 국방부, 합참, 방사청에 제출	

4. 사전개념연구 업무절차도

1.	사전개념연구 요청서 제출 (소요제기기관 → 합동참모본부)
○ 매년 2월 및 8월 말까지 다음반기(전반기 1~6월, 후반기 7~12월) 사전개념연구 요청서를 제출	



2.	사전개념연구 요청서 종합 및 우선순위 선정 (합동참모본부)
○ 합참은 소요제기기관, 방사청 및 국과연 등에 의견수렴 실시	



3.	대상과제 통보 및 수행지시 (합동참모본부 → 국과연, 소요제기기관 등)
○ 합참은 선정된 대상과제를 국과연 등에 통보(~4월 및 10월말) ○ 국과연 등은 사전개념연구 수행계획 작성 및 통보(~5월 및 11월말)	




4.	사전개념연구 수행 (국과연 등)
○ 국과연 등은 소요제기기관에 연구에 필요한 자료, 기관방문 협조 등을 요청할 수 있음 ○ 소요제기기관 및 산학연 등이 포함된 전문가 그룹 구성 가능	




5.	결과보고서 제출 (국과연 등 → 합참, 소요제기기관, 방사청)
----	---

5. 무기체계 소요기획 절차도

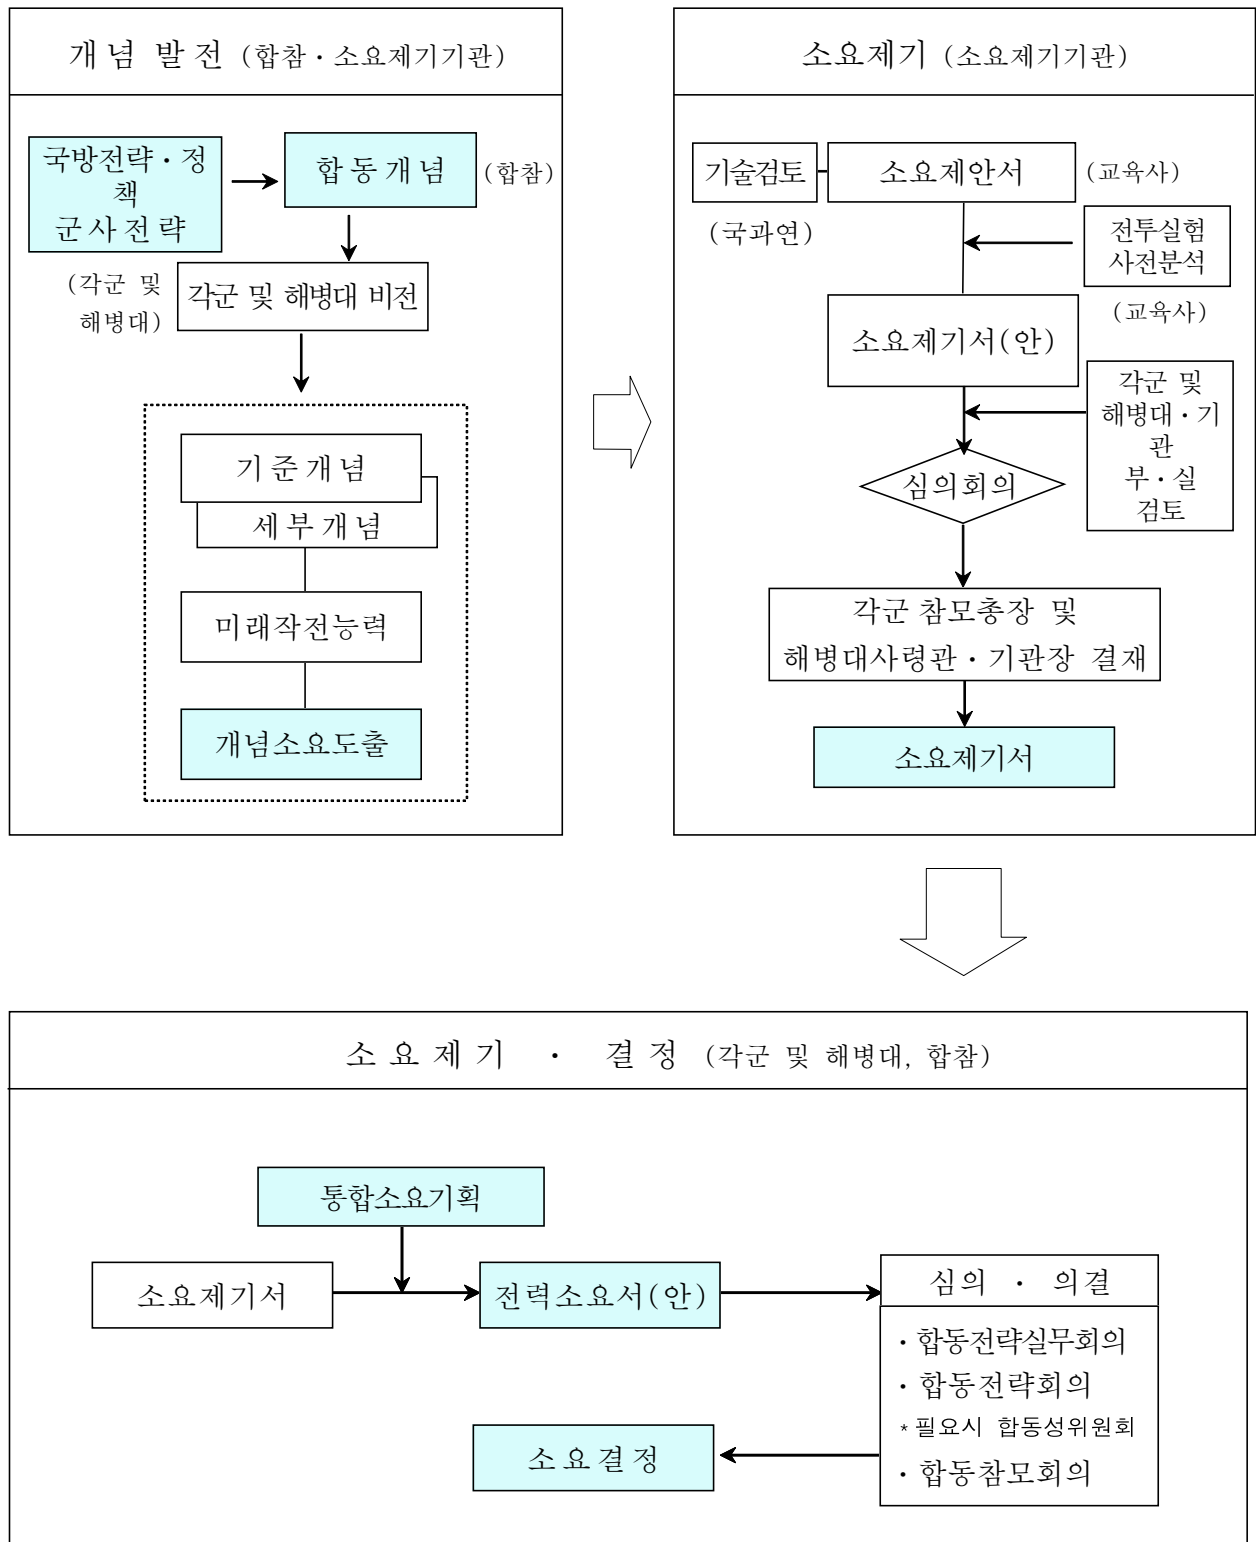


- 전력지원체계 소요제기·결정은 국방부(군수관리국, 국방정보화국)이 수행
- 소요기획 문서는 『전력지원체계 사업계획서』로 작성

6. 무기체계 시험평가 절차도

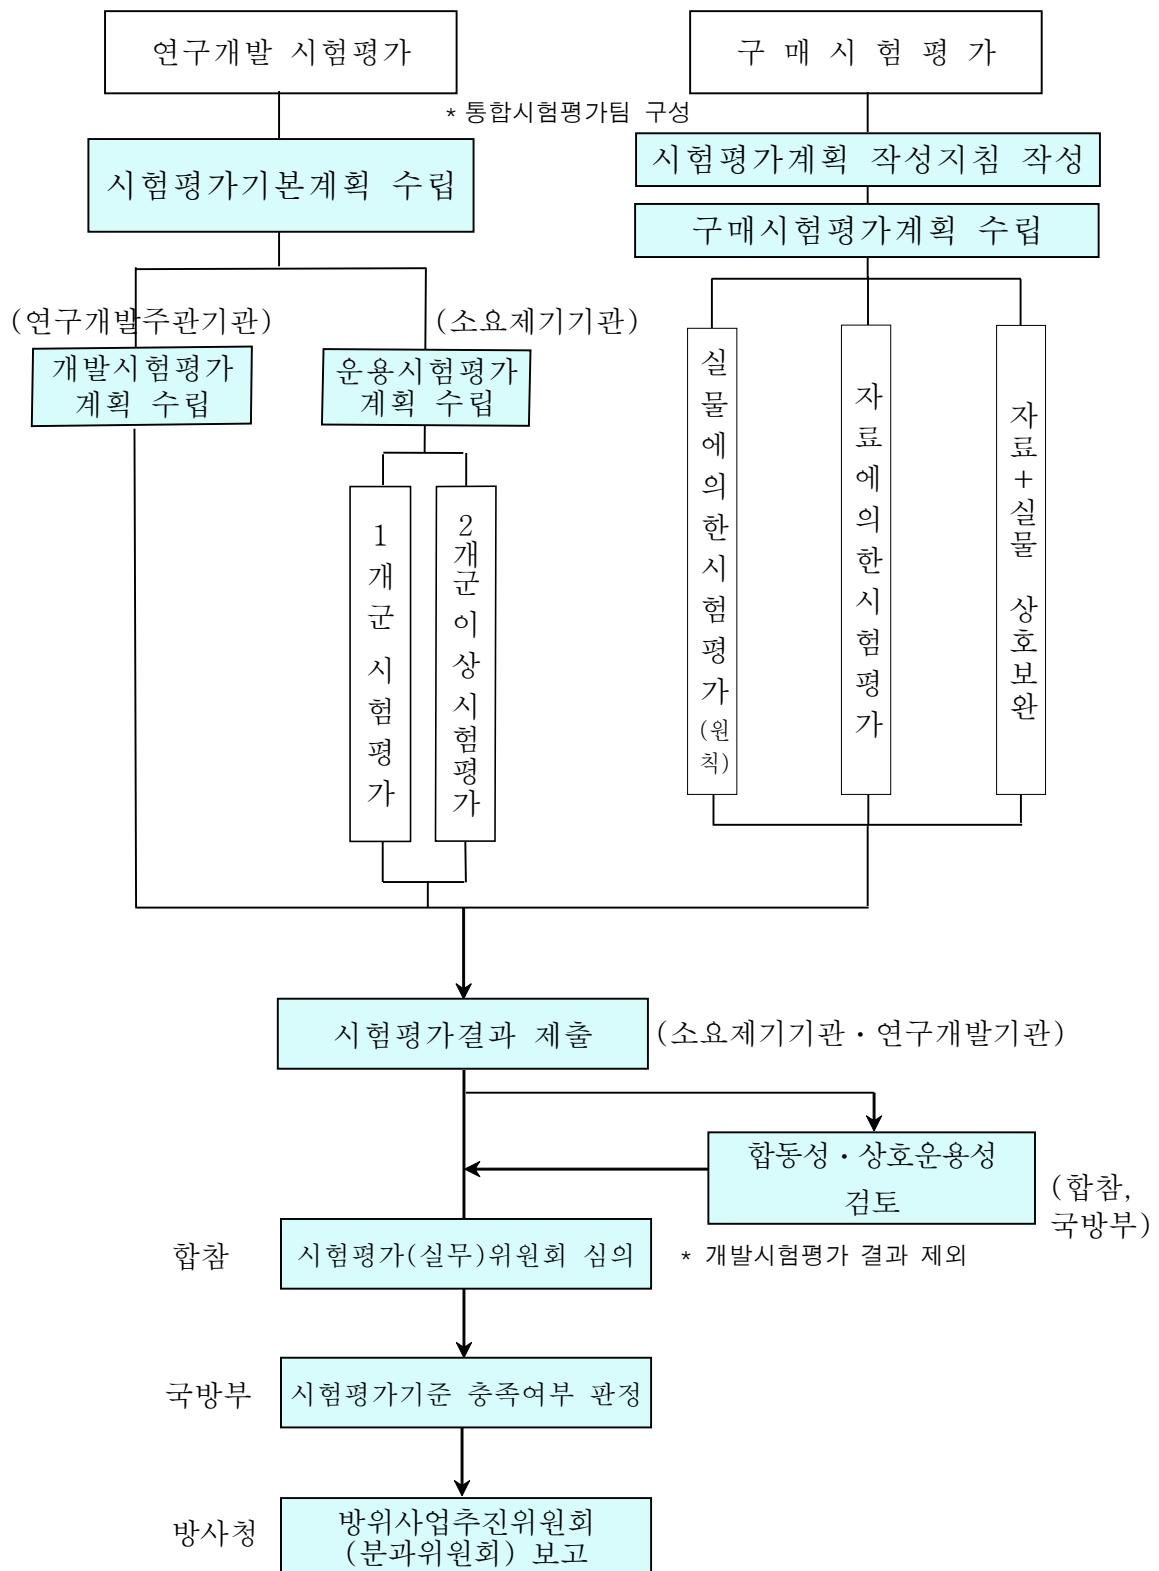


7. 무기체계 전력화지원요소 확보 절차도

○ 연구개발의 경우

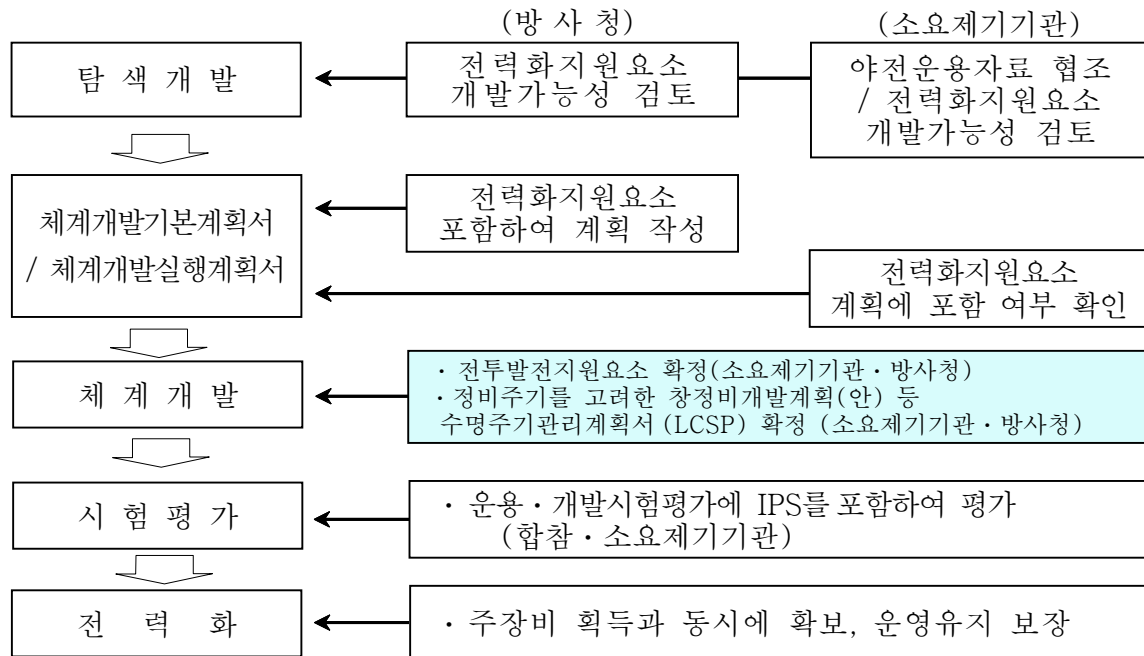


○ 국외구매의 경우

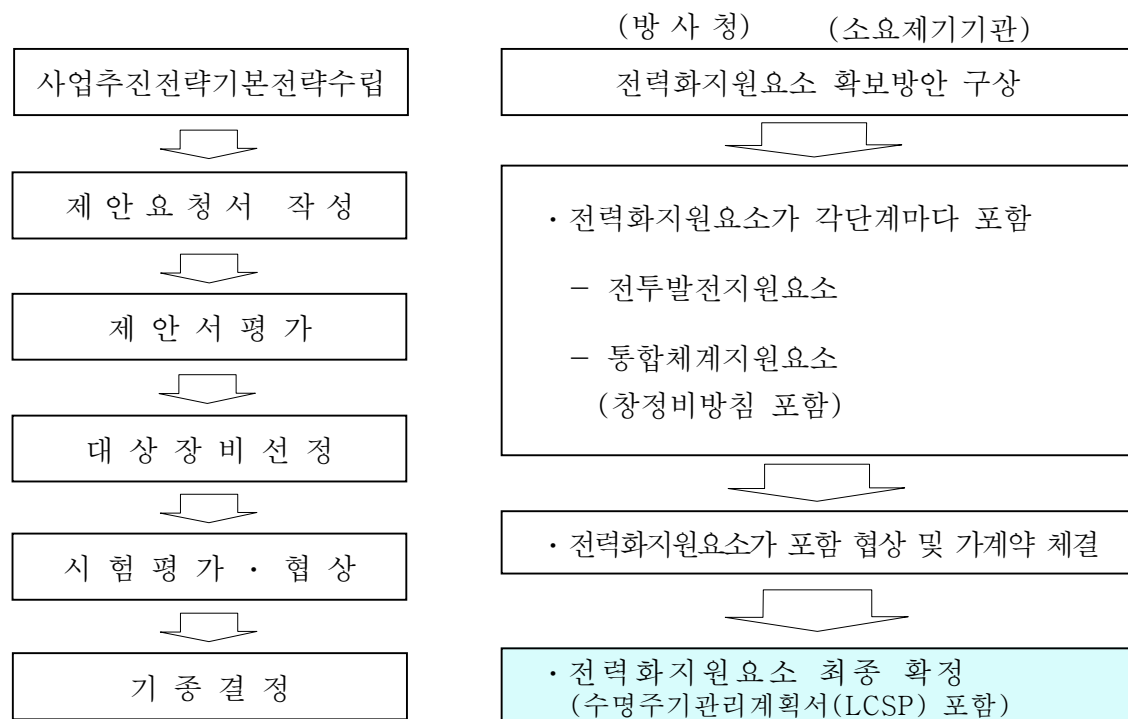


※ 2개 군 이상의 전력지원체계 전력화지원요소 관련 정책 확정은 국방부가 담당


8. 무기체계 소요수정 절차도

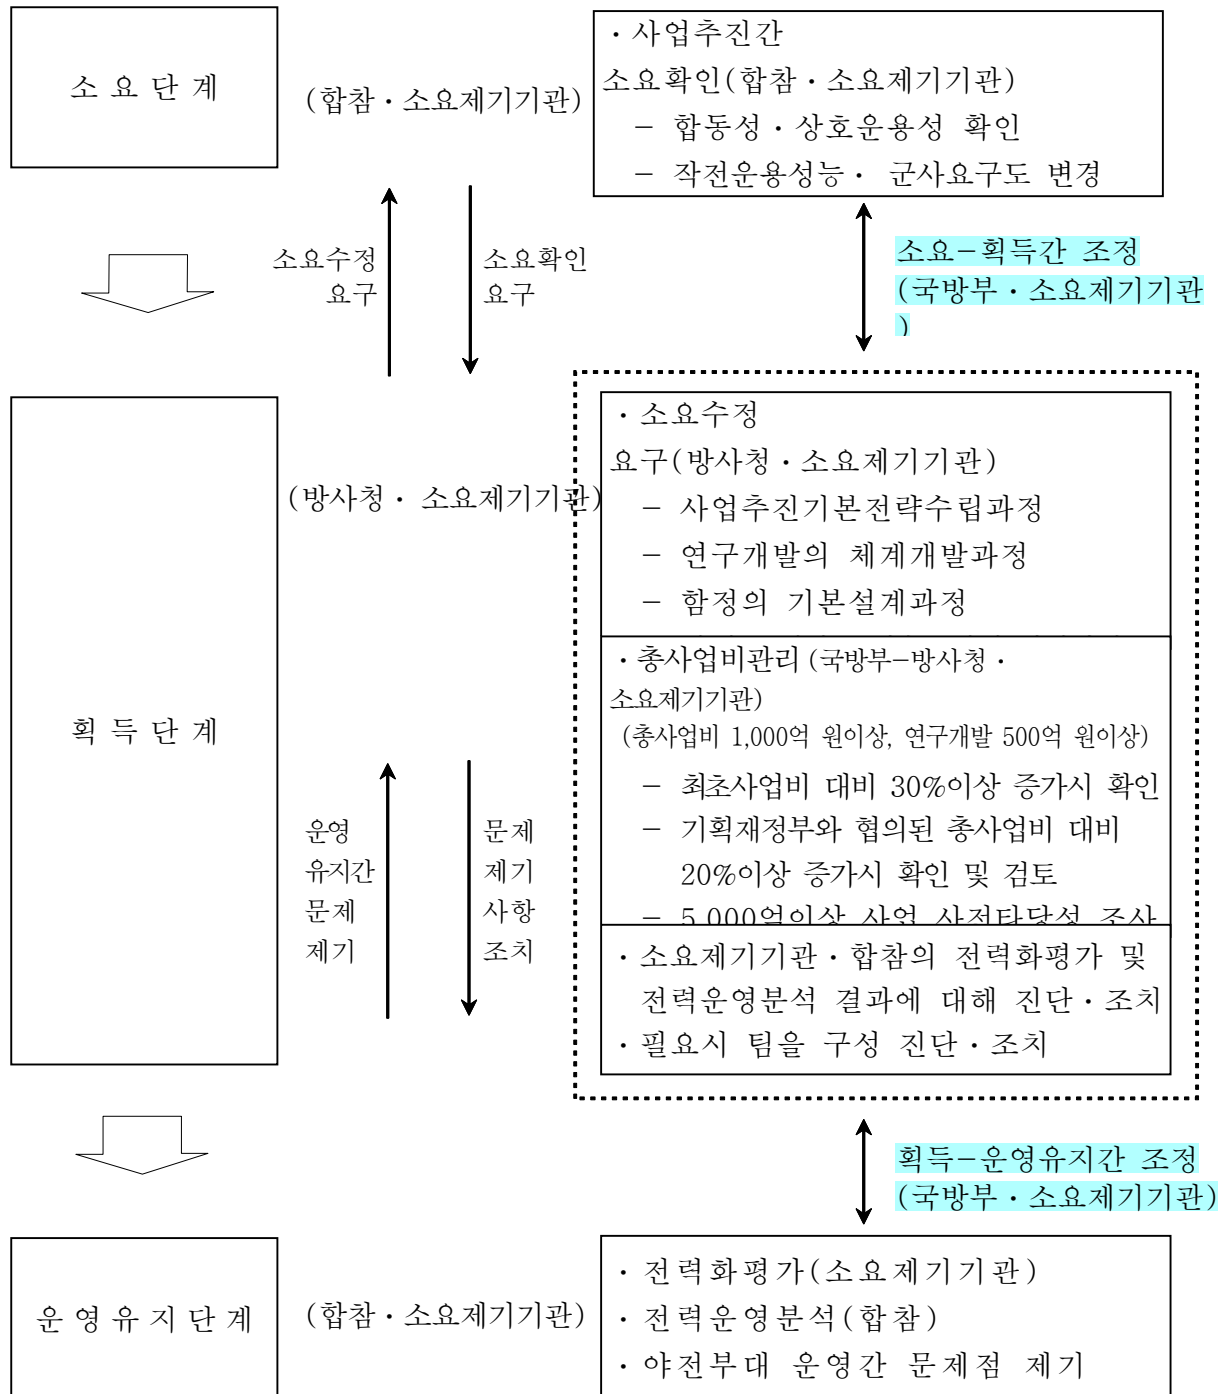

9. 무기체계 분석·평가 절차도

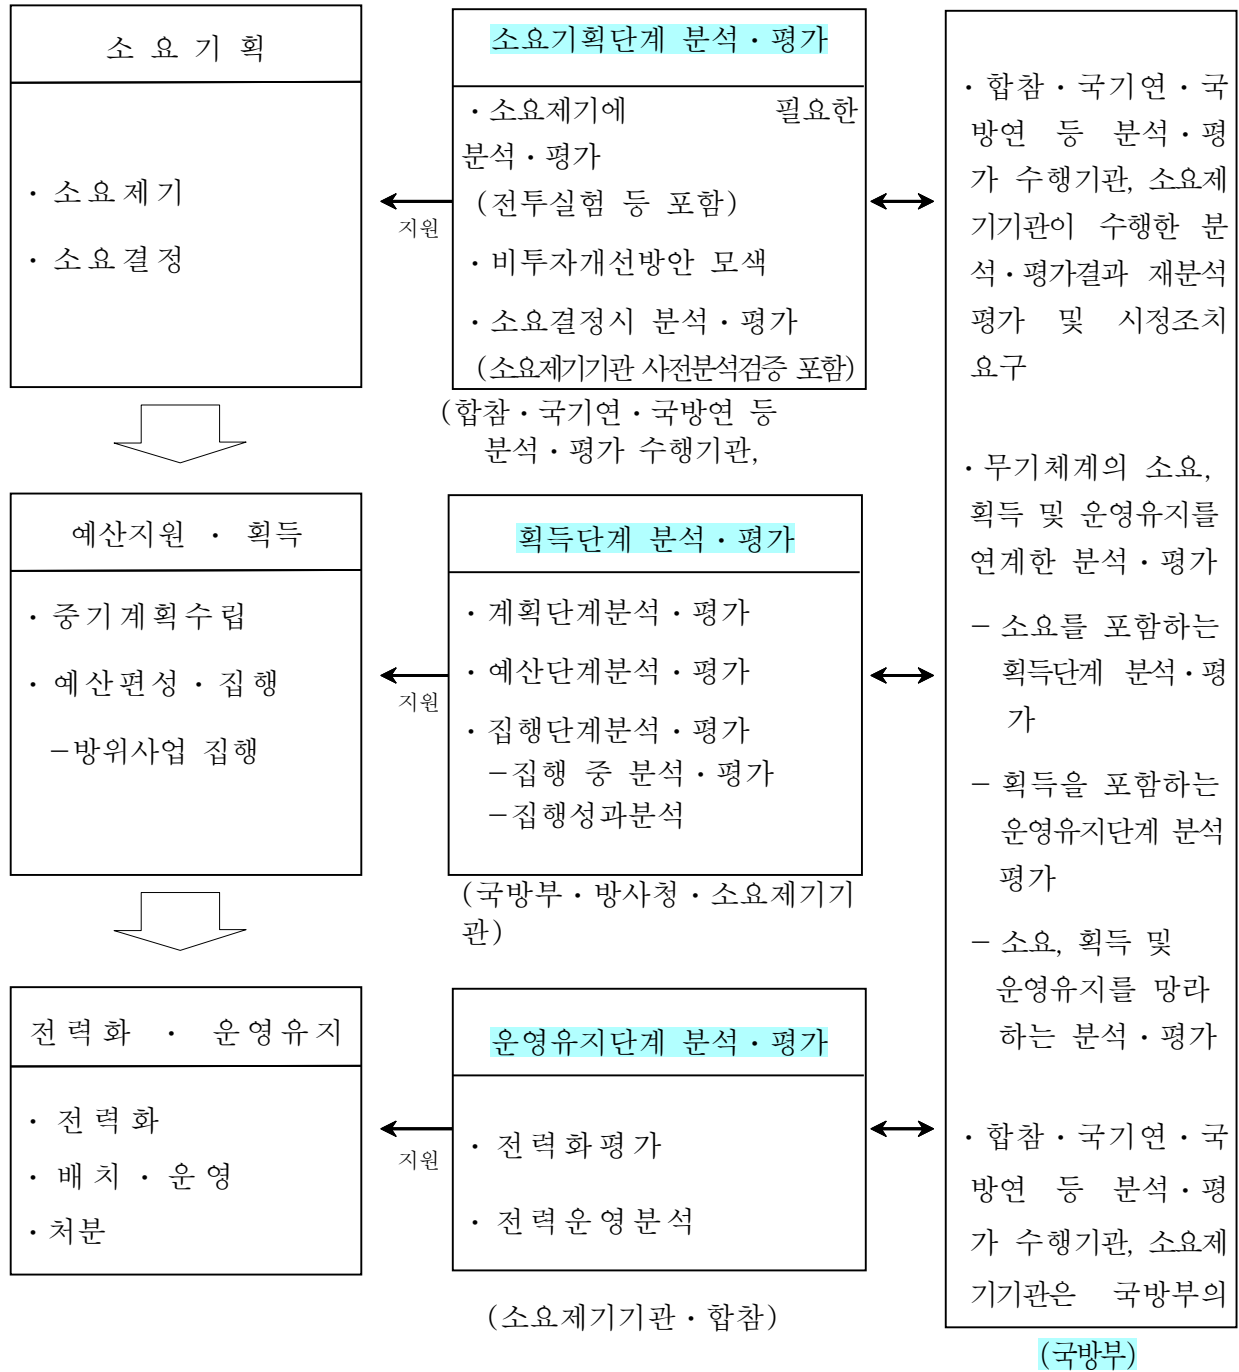


10. 암호장비 통합관리 업무절차도

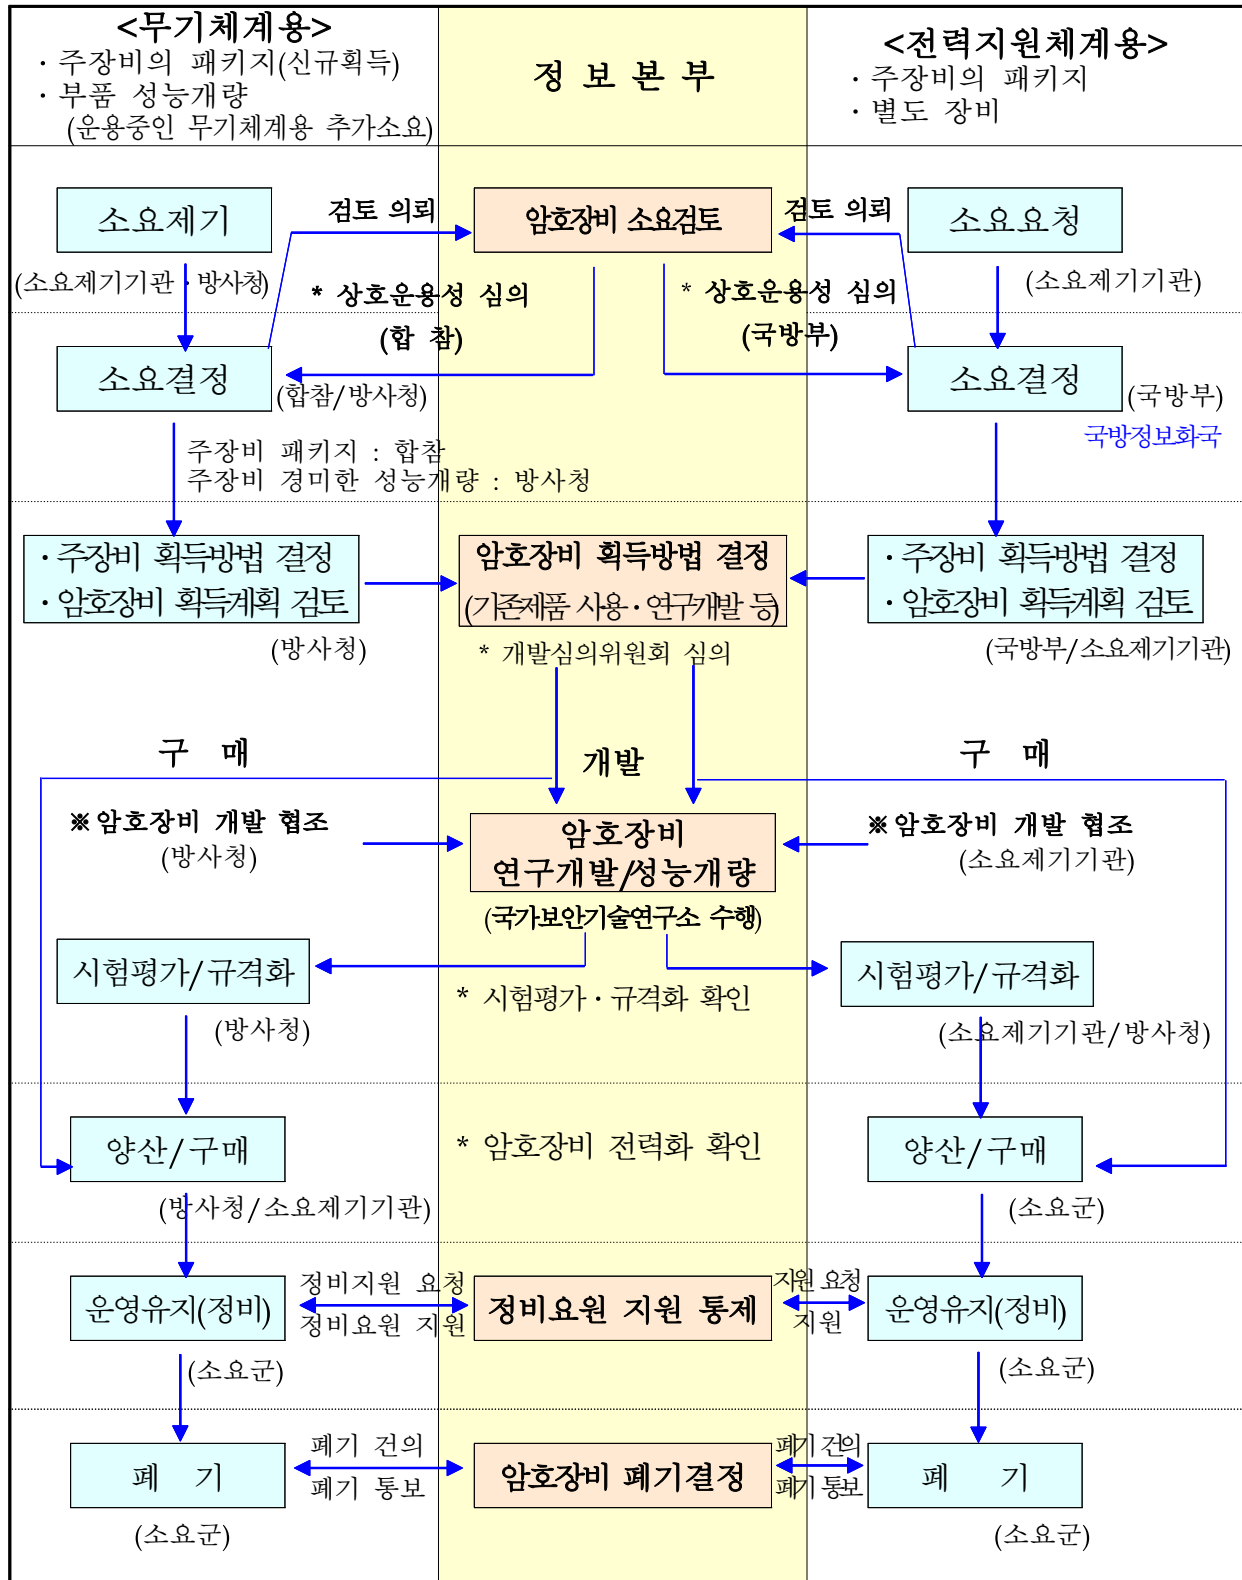


※ 국가보안기술연구소는 개발시험평가, 국방규격 작성, 규격제정 요청, 규격관리업무 수행


11. 전시 무기체계 획득업무 절차 흐름도

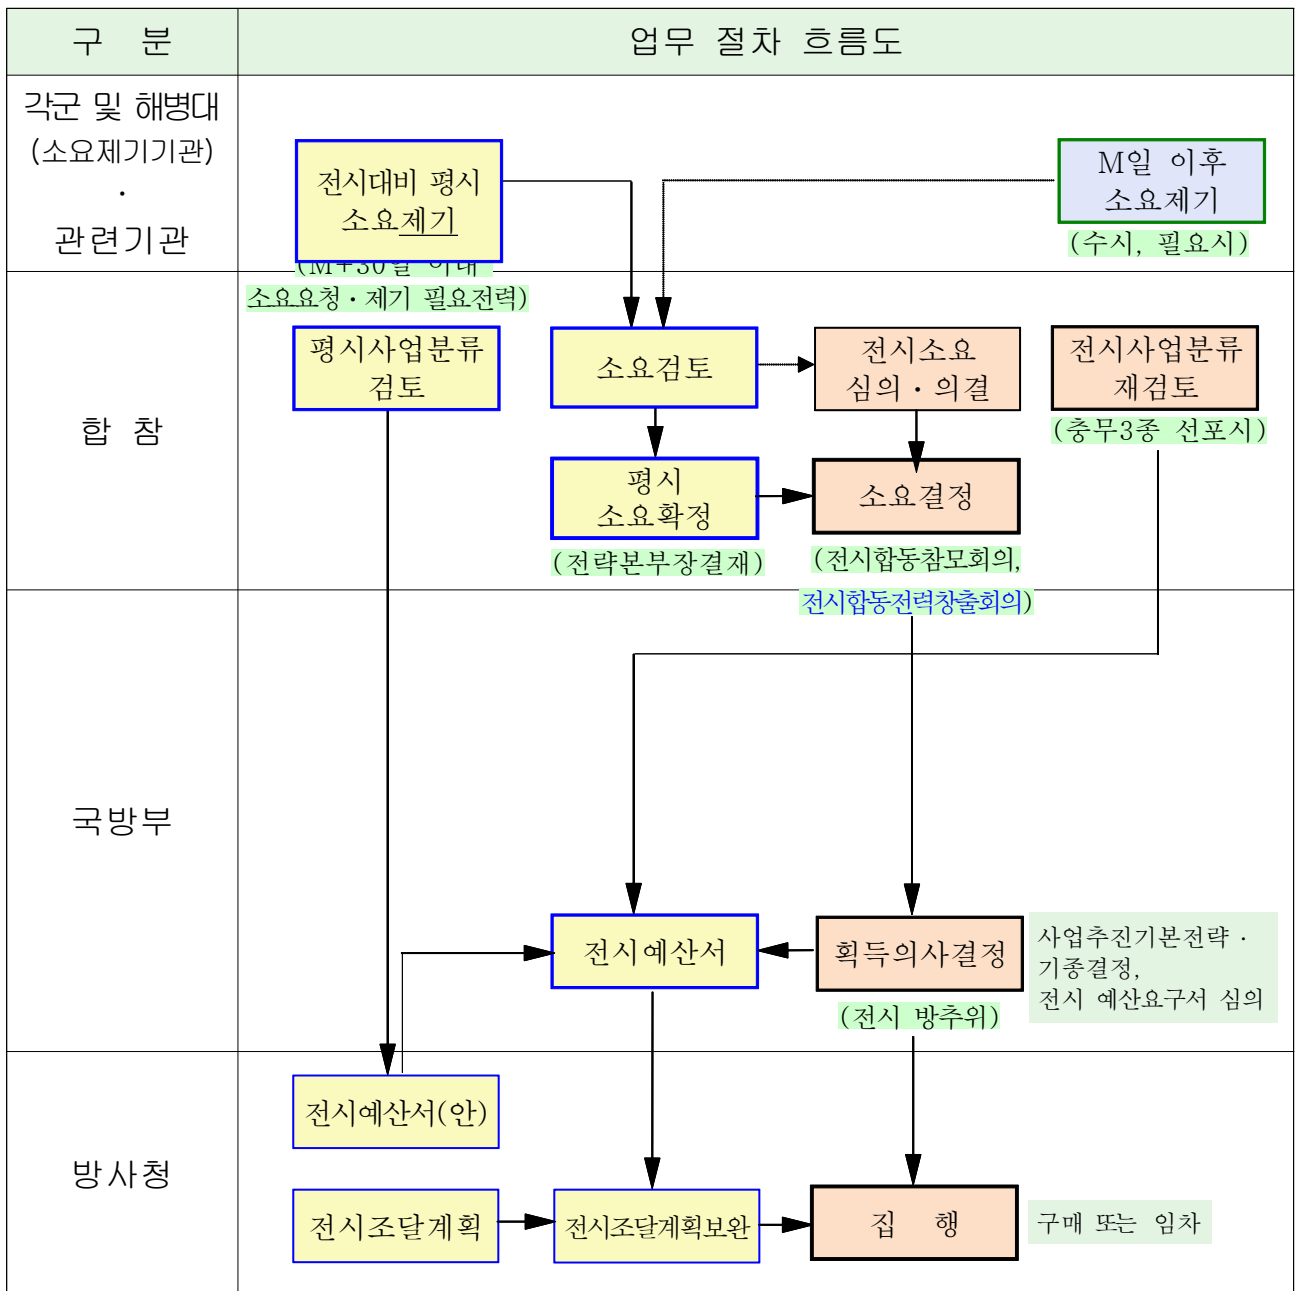

12. 전력지원체계 획득 절차도

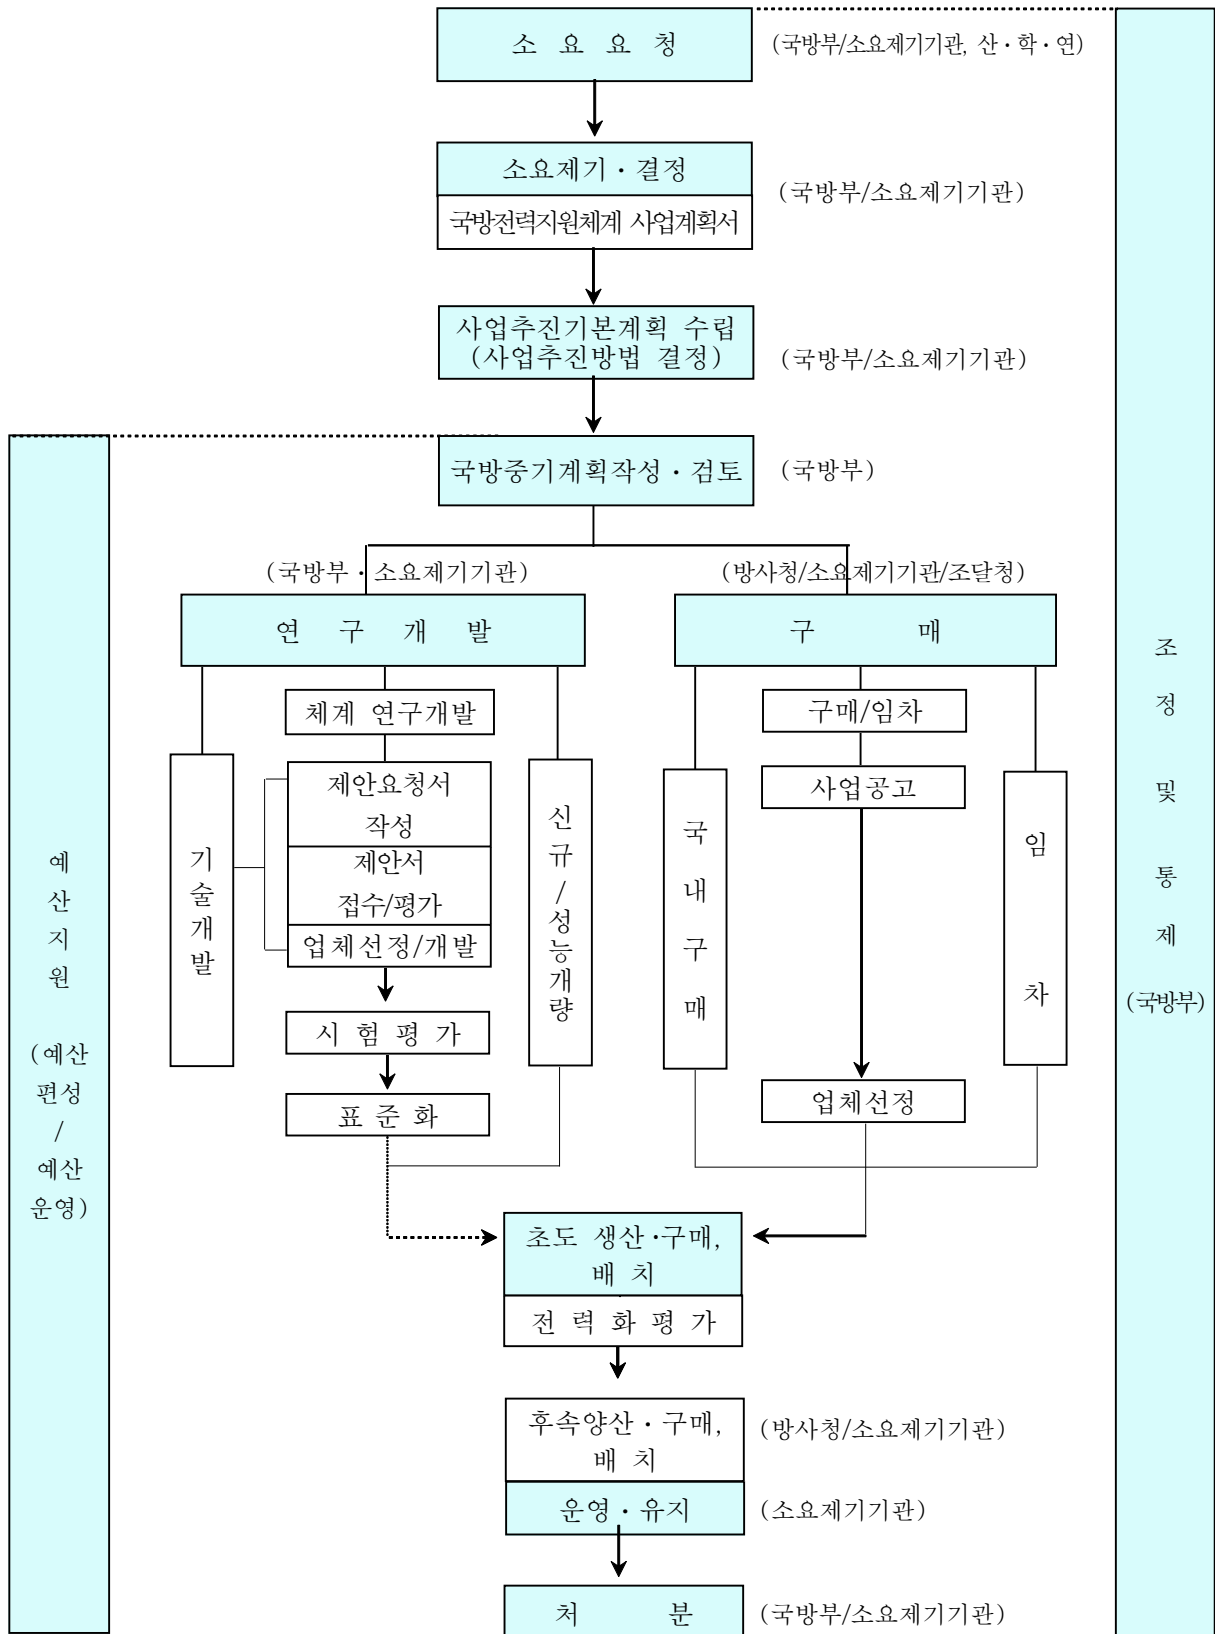

13. 주파수 획득 절차도

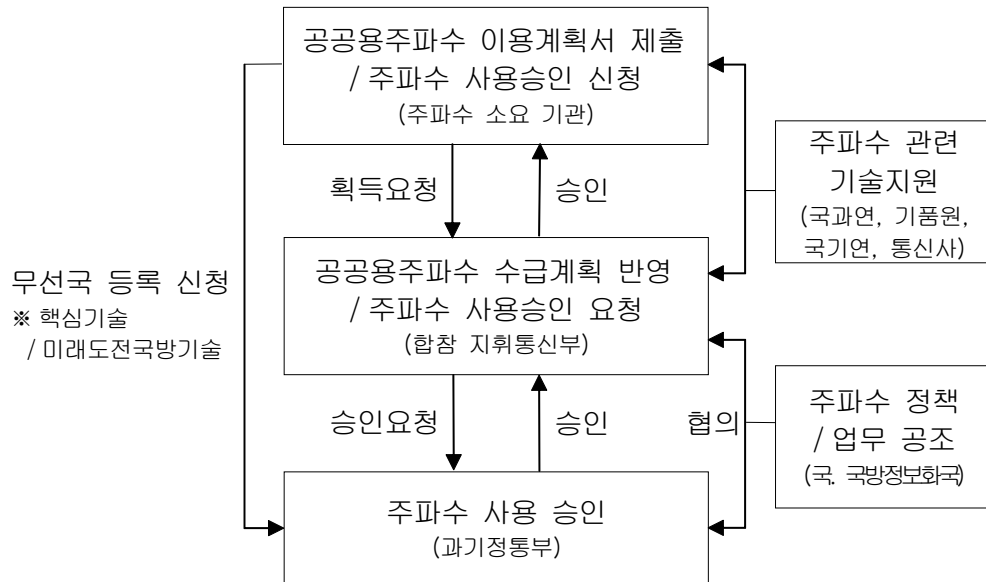

<과기정통부 공공용주파수 수급계획에 반영이 필요한 사업의 경우(무기체계 연구개발/구매)>

구 분	세 부 내 용
전력소요서(안) 작성	무기체계 소요 공공주파수 이용계획서를 합참(지휘통신부)에 제출하고, 수급계획 반영결과를 전력소요서(안)에 반영
탐색개발 보고서 작성	주파수 획득 가능성을 확인하여 작전요구성능에 반영
체계개발 수행	주파수 가용성을 지속 검토하여 주파수 사용시기 1년전 합참(지휘통신부)으로 획득요청
무기체계 구매	무기체계 대상장비 선정 시험평가 및 기종결정 이전에 주파수 획득요청을 준비하고, 기종 결정 즉시 합참(지휘통신부)으로 주파수 획득요청하여 장비 도입 이전에 주파수 사용 승인 필요
제안요청서 작성 및 평가	제안요청서 작성시 소요 주파수 획득이 제한될 경우에 대한 대책을 계약조건에 반영
시험평가	사전에 시험용 혹은 운용주파수를 승인받아 시험평가 수행

※ 위성주파수 소요 시 전력소요서(안) 작성단계 이전에 소요주파수 및 대역을 결정하여 기 할당된 주파수 사용 가능 여부 또는 신규획득(궤도포함) 여부 제시

<과기정통부 공공용주파수 수급계획에 미반영 대상 사업의 경우(핵심기술/미래도전국방기술, 시범사업, 긴급소요 등)>

구 분	세 부 내 용
핵심기술/미래도전국방기술연구개발	해당 연구기관(업체)이 사업 초기단계부터 각군 및 해병대, 합참(통신사)의 주파수 획득가능성, 검토 후 해당 연구기관(업체)이 과기정통부(전파관리소)에 무선국 개설 허가 신청
시범사업	방사청이 사업 초기 단계부터 합참(통신사)의 주파수 획득가능성 및 기술검토를 받아 주파수 소요시기 6개월 전에 합참에 주파수 사용승인을 신청
긴급전력 소요서(안) 작성	긴급소요 결정으로 인해 주파수 사용승인이 필요한 경우 소요군이 국방부, 합참의 소요결정 문서 등 관련문서를 첨부하여 합참에 주파수 사용승인을 신청
