

【별 표 2】

지뢰등의 탐지·제거 사업 실행계획서 (제10조 관련)

Ⅰ 개 요

1. 사업명 : 00지역 지뢰제거 사업

2. 목 적 * 사실에 근거하여 6하 원칙에 의거 작성

3. 대상지역 유형 : 미확인지뢰지대
* 미확인지뢰지대, 작전목적이 상실된 기설치 지뢰지대. 기타 위험지역 중 한 가지를 기록

4. 주요 경과 * 지뢰제거 사업 관련 배경 / 이력을 작성
가.
나.

5. 일반 계획

- 가. 위 치 :
나. 주 체 : ○○○○○ 00명(현장관리자 : 홍길동)
다. 기 간 : 00년 0월 ~ 00년 0월 (00개월)
라. 면 적 : 000㎡ * 계속사업이 필요한 경우 연차별 면적을 구분하여 작성

구 분	총면적	누계	'26년	'27년	비 고
사업면적(㎡)			00	00	'27년 완료 예정

- 마. 예 산 : 000억원
바. 지뢰제거 주요 방법 : 인력(장비)에 의한 방법
사. 투입장비 현황 * 주요 탐지장비 위주 기록(안전장구류, 탐지장비/물자) **【별지 1】**

구 분					
수량(대)					

아. 탐지/제거 기준 : * 세부 검증기준을 명확하게 기록

6. 세부 추진일정 * 구역 구분이 필요할 경우 구역별 기록, 세부 일정 표기


구 역	3~4월	5~6월	7~8월	9~10월
A구역				
B구역				
⋮				

7. 현장 시설배치도 * 지뢰제거 지역 뿐만아니라 상황실, 휴게시설 위치도 포함된 요도

* 추가적으로 안전장구류를 전부 착용해야 하는 위험지역, 안전장구류를 벗고 자유롭게 다닐 수 있는 안전구역을 명확하게 구분 (실제 현장에서도 안전테이프 등으로 구획을 구분)
* AMB 등 위치 도식

8. 지뢰제거자 관리현황 * 아래 기구도를 참고하여 구체화된 팀 편성
가. 조직도

【별지 2】

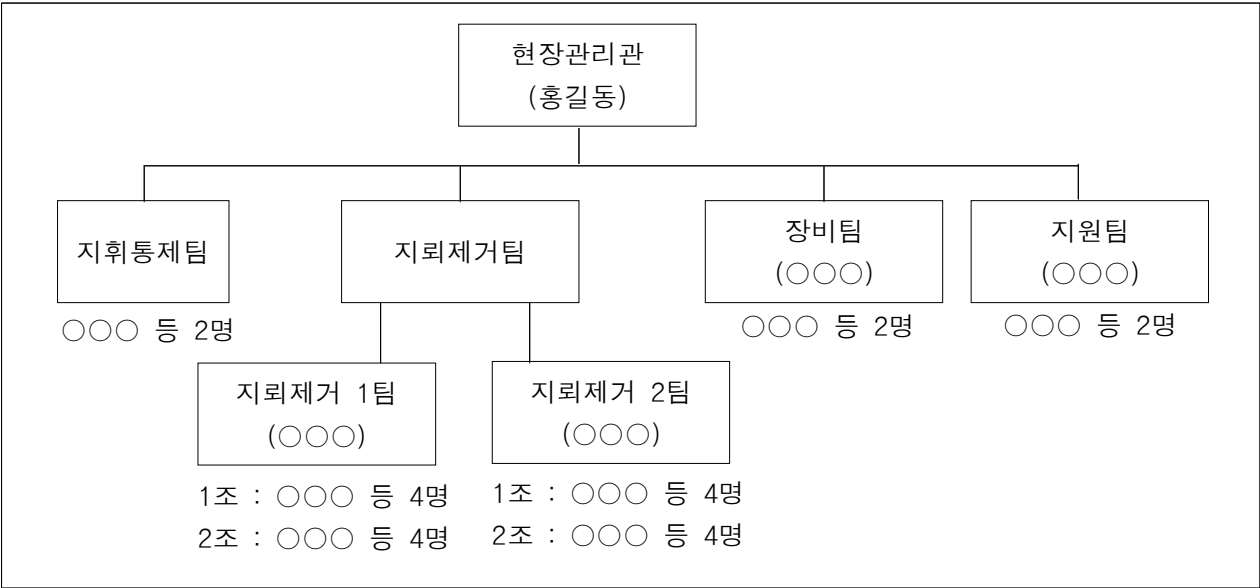

나. 주요 임무현황 * 현장관리관 및 팀장급(간부) 위주로 기구도와 연계하여 주요 임무를 기록

구 분		계급 성명	주요 임무
현장관리관		홍길동	
지휘통제	팀장	○○○	
지뢰	1팀장	○○○	
제거팀	2팀장	○○○	
장비팀	팀장	○○○	
지원팀	수송지원	○○○	
	의료지원	○○○	
	⋮		

II 현장특성 분석

1. 지형·지리적 특성

가. 전체 특성 * 1) 지역의 특성을 전체적 관점에서, 2) 대상지역 관점으로 구분해서 사실위주 기록
1)
2)

나. 인근 주요시설, 교통 및 주민 현황

1)

2)

다. 주변시설 :

라. 사업지역 위치 * 제거지역 주변의 교통, 주거 등 입지적 여건을 확인하기 위함

지도

마. 제거지역 토지 : 논밭 00%, 임야 00%, 유휴지 및 나지 00%

바. 제거지역 평균 경사도 : 00~00%

“ARC-GIS 및 TERRA활용 분석”

* 지뢰제거지역 요도를 표시, 특성이 분석되도록 도식

사. 경사도 고려 지뢰제거에 미치는 영향 * 구역별로 기술

1)

2)

2. 토양 조건

가. 전체 특성

1)

2)

나. 토질 분석

1) 표토층 두께 : 00mm

2) 토양 유형 :

3) 자철 / 금속함량 :

4) 암석 노출율 : 전체 면적의 00%

다. 식생분석 : 구역 A,B는 식생 00% 미만 분포, 구역 C,D는 식생 00% 분포(00목 %, 00목 %)

식생 및 토질, 배수 관련 현황

* 지뢰제거지역 요도를 표시, 특성이 분석되도록 도식

라. 토양 조건 고려 지뢰제거에 미치는 영향 * 구역별로 기술

1)

2)

3. 기후 및 기상 영향도

가. 전체 특성

1)

2)

나. 연평균 강수량 : 0,000 ~ 0,000 mm

다. 평균기온 : 여름 00~00 / 겨울 00~00

1) '00~'00년 기후 및 기상 평균

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
강수량	00mm											
기온	00℃											

2) '00년 기후 및 기상(예상)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
강수량	00mm											
기온	00℃											

라. 연 가용일수 판단 : 000일(00개월)

III 사고 예방·대응 및 주변 환경오염 방지대책

1. 안전보건관리계획

가. 위험요인, 위험성 및 저감대책 * 자체적으로 단계를 구분하여 위험요소, 위험성, 저감대책을 기록

단 계	위험요소	위험성	저감대책

나. 안전사고 예방 활동

- 1)
- 2)

다. 위험수준평가 : 사전조치 이전까지 완료

【별지 3】

라. 통제부대 위험성 평가 * 통제부대의 활동을 확인하여 기록

- 1) 주관 / 시기 :
- 2) 내용 :

마. 현장 위험성평가

【별지 4】

- 1) 주관 / 시기 :
- 2) 내용 :

바. 위험예지훈련 * 투입전 정신교육 등의 활동 / 구호제창 등의 행위로 시기 및 방법 등을 기록

- 1) 주관 / 시기 :
- 2) 장소 :
- 3) 내용 :

사. 주요장비 수리·보수 및 점검 이력 * 지뢰탐지기, 굴삭기, 공압기에 한정하여 수리, 보수, 점검 결과를 기록

구 분			

아. 주요장비 점검 계획 * 지뢰제거에 소요되는 장비를 언제, 누가, 어떻게 점검을 하는지 기록

구 분	점검주기	점검자	점검 중점 * 각각 기록

2. 안전사고 발생 시 조치계획

가. 지뢰 폭발 시 조치(#1)

구분	주요 유형	세부조치
1단계		
2단계		
3단계		
4단계		

나. 장비 전복 시 조치(#2)

구분	주요 유형	세부조치
1단계		
2단계		
3단계		
4단계		

다. ○○○○ 시 조치(#00)

구분	주요 유형	세부조치
1단계		
2단계		
3단계		
4단계		

⋮

* 발생 가능한 사고 유형을 염출하여 조치 방안을 기록

3. 응급의료지원 체계

가. 보고 체계

나. 헬기장 위치

헬기장 명칭	좌 표	관리부대	시간/거리

다. 응급 의료시설

1) 군 병원

구 분	응급실		지휘통제실	시간 / 거리
	軍 전화	일반 전화	軍 전화	
〇〇병원				
〇〇병원				

2) 민간병원

구 분	민간병원		시간 / 거리	비고
	민간병원	전화번호		
〇〇지역				
〇〇지역				

라. 응급 의료시설 요도

* 제시한 응급시설(군, 민간병원) 등의 위치가 지뢰제거지역 기준으로 이동수단별 거리, 동선, 이동소요시간을 표현

* 이동 수단 : 차량대기장소 및 헬기장 위치 도식

4. 화재예방 및 대응 계획

가. 화재 위험요소 및 저감 대책 * 위험수준 평가와 유사하게 작성

구 분	위험요소	위험성	저감대책
⋮			

나. 소화기구류 설치 계획 * 아래 내용을 참고하여 시설, 위치, 수량 등을 기록

소방시설	설치위치	수 량	비 고
⋮			

다. 소방훈련 계획 * 지뢰제거 실시 전 및 진행간 소방훈련 계획을 기록

- 1) 일시 / 장소 :
- 2) 주관 :
- 3) 주요 상황 :

라. 방화대 편성 * 아래 양식을 참고해서 방화대 편성 및 임무부여

구 분		책 책	주요임무	비 고
방화대장			· ·	
방화조	조장		· · ·	
	조원		· ·	
파기조			· · ·	
			· ·	
⋮				

마. 소방시설 현황 * 최/기의 시설을 기록

구 분	소방서	전화번호	시간 / 거리	비고

바. 화재 발생 시 조치방안 * 지뢰 제거 중 화재 발생 시 조치방안을 단계적으로 기록

5. 환경관리계획

가. 환경오염 유발요소 * 지뢰탐지/제거 활동 간 예상 가능한 요소를 기록

구 분	발생요소	환경영향	저감대책
토양오염			
수질오염			
생태훼손			
대기오염			

나. 복원 계획 * 위 사항 발생 시 조치방안을 기록

구 분	복원계획
토양오염	
수질오염	
생태훼손	
대기오염	

IV 현장 표준운영절차

1. 사전조치 목록 * 실행계획 제출 이후 지뢰 제거를 시작할 때까지 준비해야 할 요소를 망라

가. 교육훈련

- 1) 공병학교 전문교육 :
- 2) 팀별 교육훈련
가)
- 3) 팀별 평가 (개인수준평가표(안))
가)
- 4) 응급조치 교육
가)

【별지 5】

나. 지뢰제거 지역 현장 준비

- 1) 현장 준비 활동 * 지뢰 제거지역 상황 고려하여 현장준비 활동을 구체적으로 기록

--

- 2) 관할부대 협조 : 00.00. / ○○부대 작전장교
- 3) 상황실 구성 : 00.00. ~ 00.00.
- 4) 외부 시설물 설치 : 00.00. ~ 00.00.
- 5) 플래카드 부착 : 00.00.
- 6) 대대장 최종 확인 : 00.00.

다. 지자체 및 주민 설명회

- 1) 주관 :
- 2) 장소 / 일자 :
- 3) 내용 :

라. 지자체 및 주민 설명회(2차)

- 1) 주관 :
- 2) 장소 / 일자 :
- 3) 내용 :

마. 지뢰제거자 전원 현장견학 및 교육

- 1) 주관 :
- 2) 장소 / 일자 :
- 3) 내용 :

2. 지뢰등의 탐지·제거 절차 및 방법 * 탐지 및 제거절차가 가시화 될 수 있도록 세부적으로 작성

가. 제거지역 요도

* 제거 지역을 확대하여 세부적으로 표시, 구역별 구분하여 투입할 경우 구역 구분 실시, 최초 투입 지역 / 통로 등 명시

나. 제거 주요 절차

1)

* 주요절차는 큰 범주에서 제거지역을 어떻게 구분해서 어떤 방식으로 투입할 것인지 확인할 수 있도록 기록

※ 주요 절차(사진)

1단계	2단계	3단계	4단계
5단계	6단계	7단계	8단계

* 주요 절차에 대한 사진을 포함하고, 필요시 하단에 세부 설명을 추가

다. 제거 세부 절차

* 육군의 표준운영절차(안) p.5-2 ~ p.5-15를 참고하되 현장에 부합하도록 실제 제거방법을 구체적으로 기록, 사진 및 그림 포함

1) 지뢰제거 절차

* 구역별 검증 전 단계까지의 지뢰제거 행동절차를 기술(3~4장)

가)

나)

2) 지뢰발견 시 절차 *지뢰 발견 시 ~ 처리 시까지의 행동절차를 기술

【별지 6】

가)

나)

3. 완료보고 및 검증

가. 완료보고

【별지 7】

1)

나. 검증

【별지 8】

1)

구 분	내부 검증	외부 검증

V 품질관리계획

1. 품질관리계획

【별지 9】

* 지뢰 제거를 완벽하게 실시하기 위한 제반 활동사항을 기록, 평가, 점검, 확인 등의 활동을 수회 실시한다면 해당 일자를 기록하거나 주기 및 방법을 기록

구 분		품질관리 내용	근거 유지	시기	수행기관(자)

VI 비상시 긴급조치계획

1. 예상되는 비상 상황 * 발생 가능한 상황을 염출

가.

⋮

2. 세부 조치계획 * 상기 발생 상황을 고려, 염두 판단하여 조치사항을 기록

가.

⋮
